

REPORT QUINDICINALE N. 146

Periodo di riferimento: 16 Aprile 2017 – 30 Aprile 2017



INDICE REPORT

1. DATI GENERALI	3
2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE	4
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE.....	5
3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno.....	5
3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato	6
4. SEZIONE CANTIERI	7
4.1. Elenco cantieri fissi	7
4.1.1. CANTIERE STAZIONE	8
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE	9
4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO	10
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA	11
4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'	18
4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI	20
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE	21
4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI	22

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA VELOCITA' DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).

COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.


ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE	10/03/2010
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE	13/10/2010
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale):	27/08/2015*
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):	15/11/2016*


**) istruttoria di proroga in corso*

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

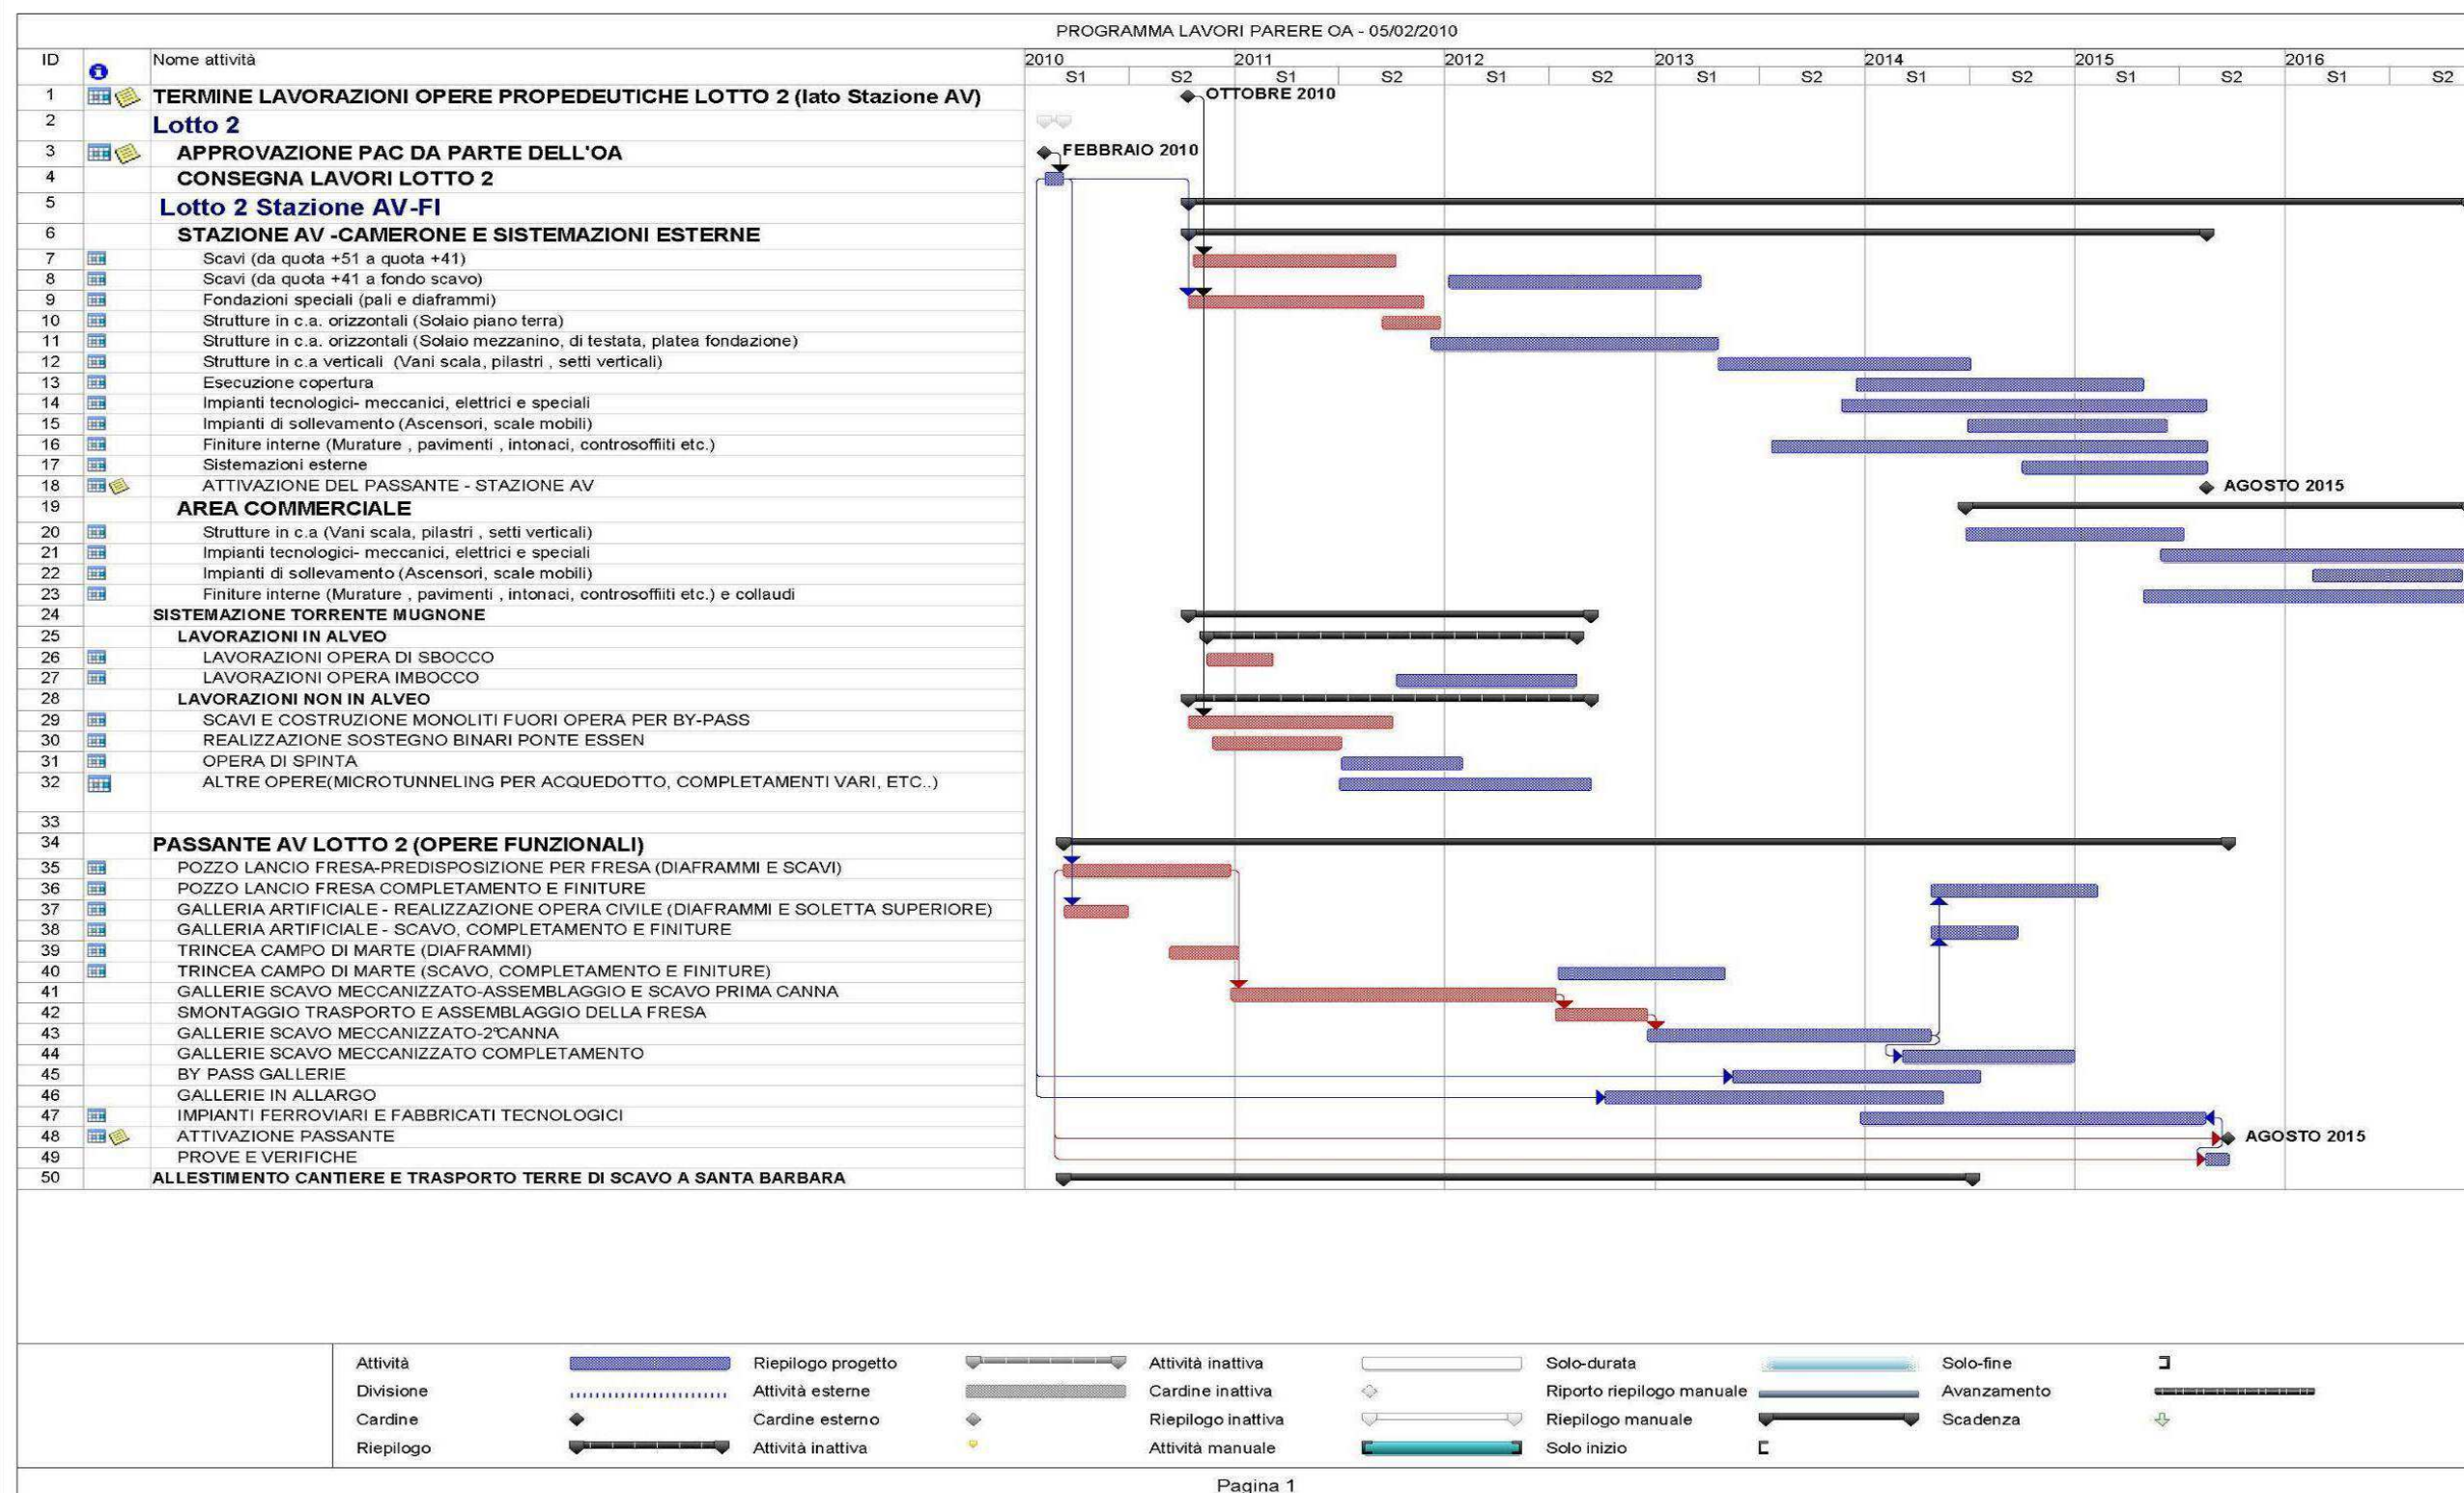

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

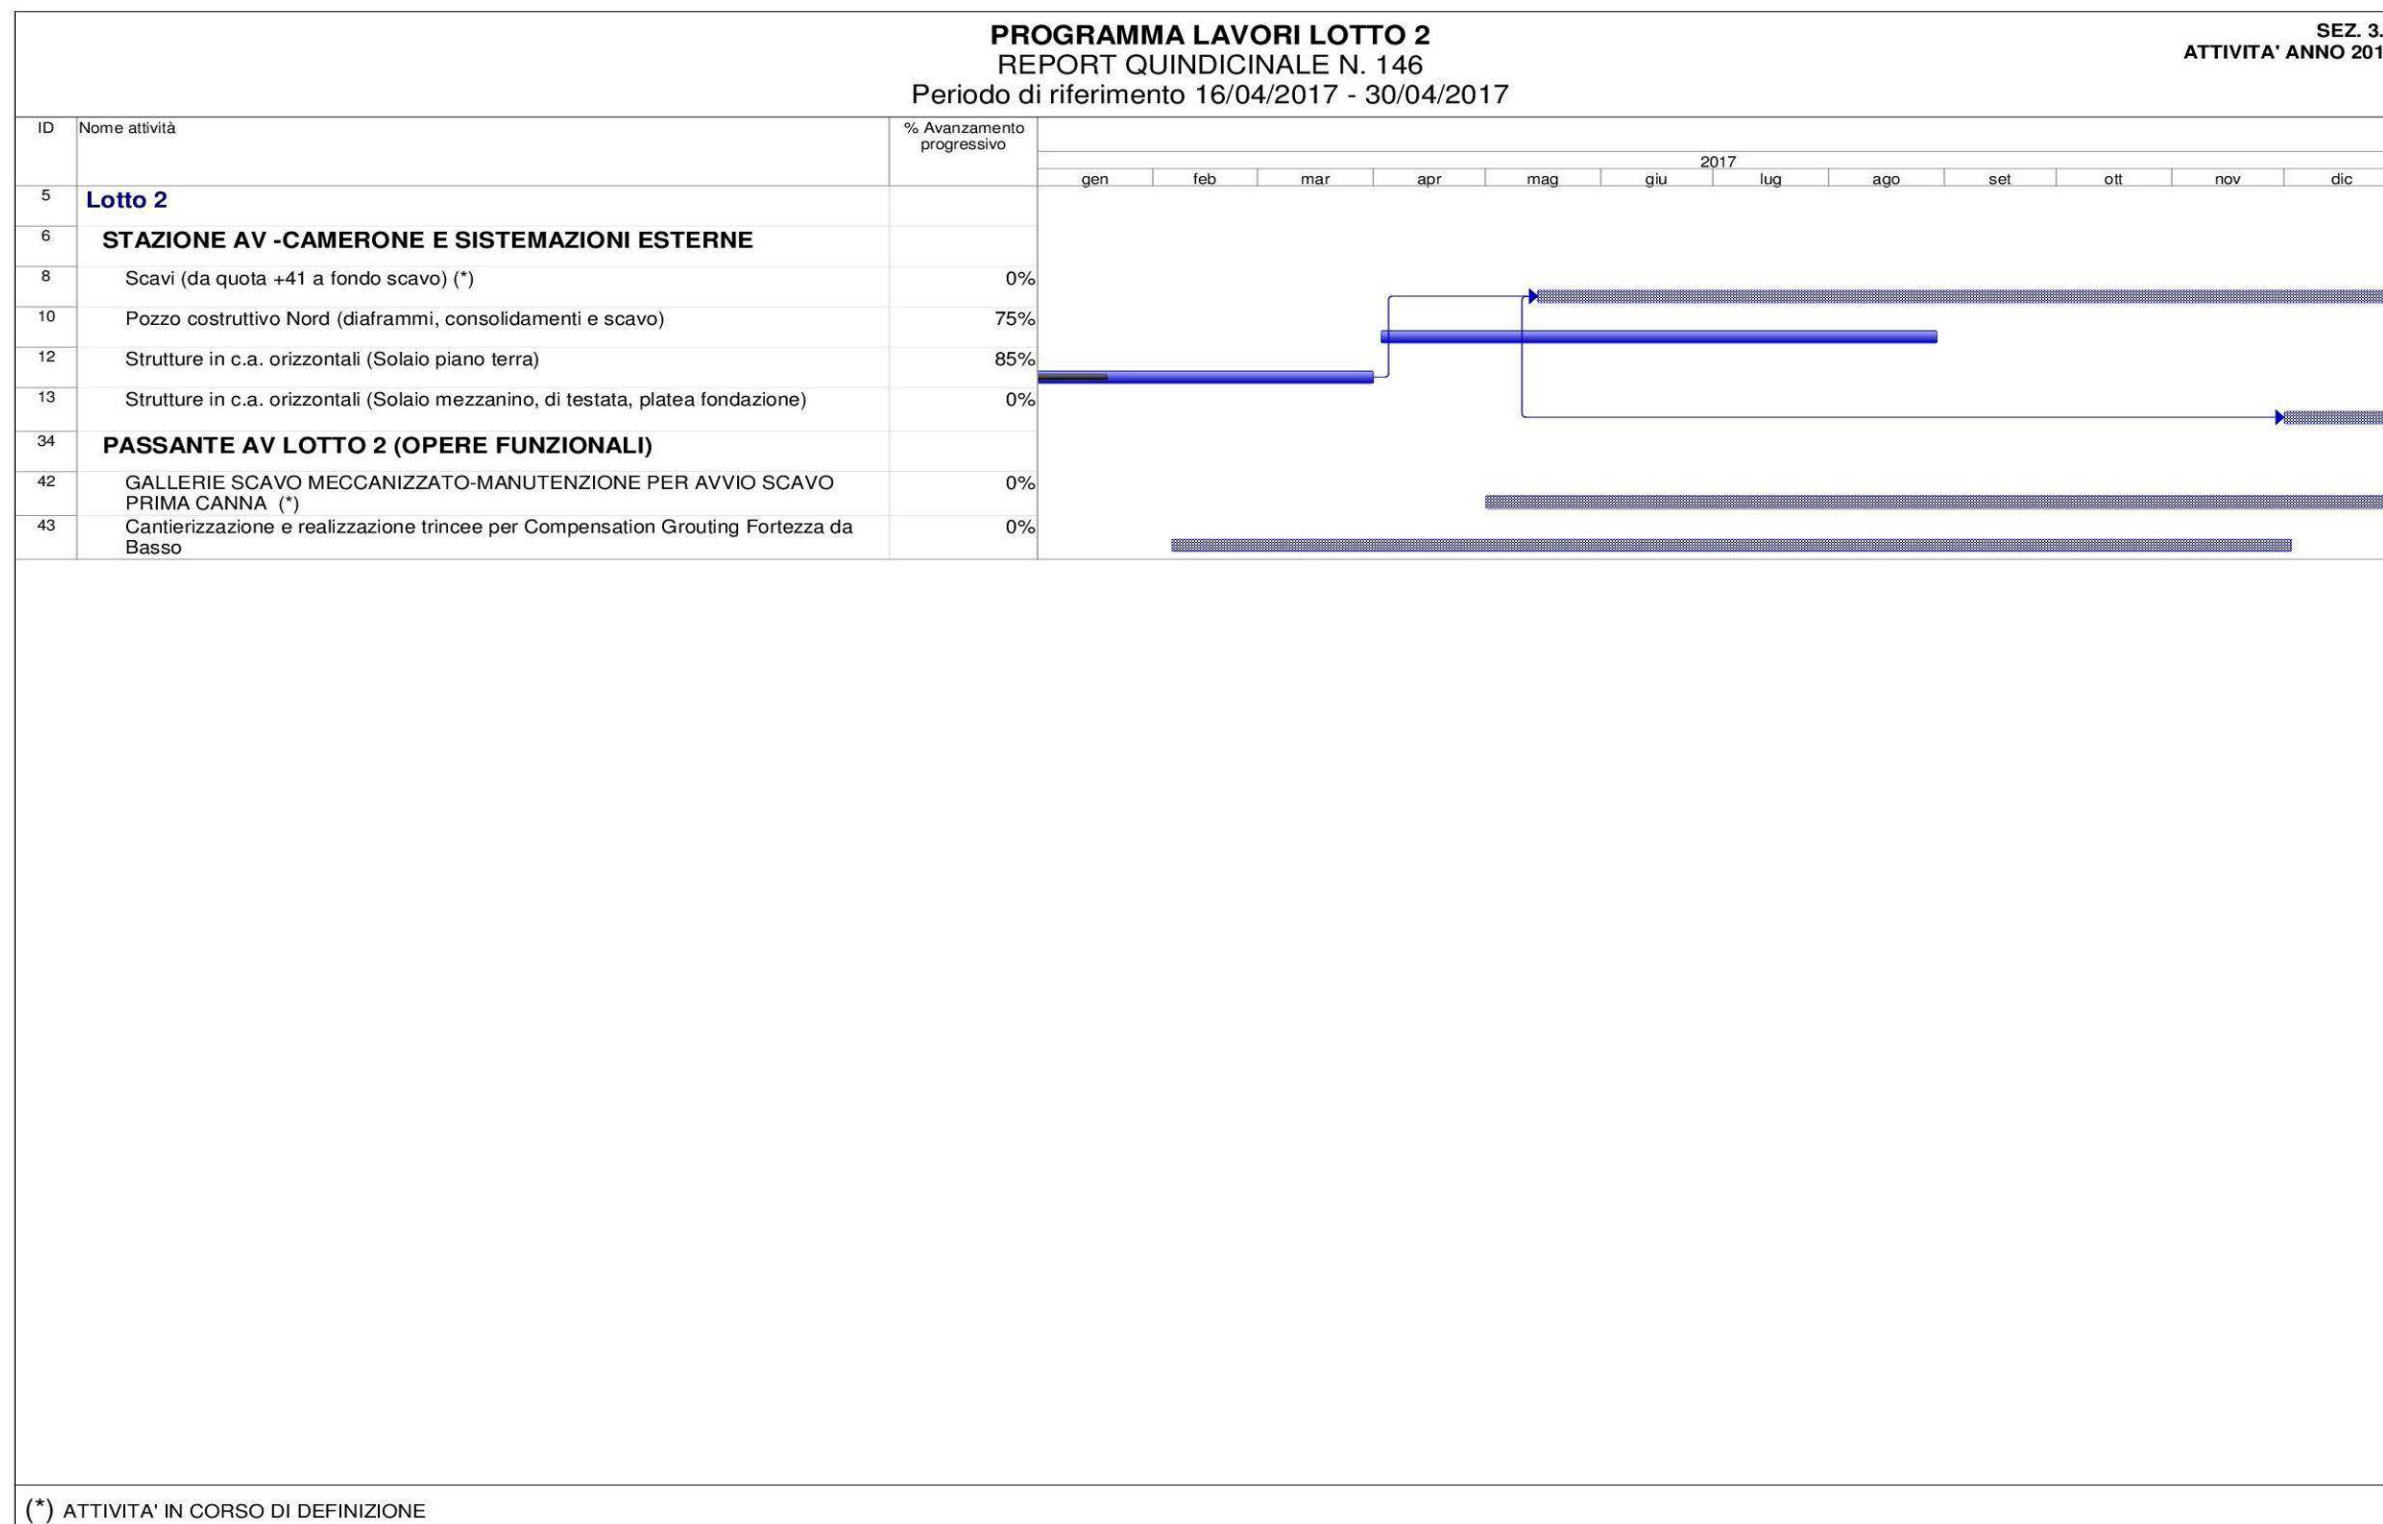

3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

- **CANTIERE STAZIONE**
- **BY PASS MUGNONE**
- **CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO**
- **AREA FORTEZZA**

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

REPORT QUINDICINALE N. 146

Periodo di riferimento: 16 Apr 2017 – 30 Apr 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
SCAVI (da quota +51 a quota +41)	21/11/2011	25/04/2015	1251	100%														Attività ripianificata a seguito di richieste Arpat
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)	15/05/2017	07/08/2019	815	0%														
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)	13/10/2010	09/06/2015	1701	100%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano terra)	16/07/2015	31/03/2017	625	85%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)																		
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, pilastri, setti verticali)																		
ESECUZIONE COPERTURA																		
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI																		
FINITURE INTERNE (Murature, pavimenti, intonaci, controsoffitti etc.)																		
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, consolidamenti e scavo)	09/08/2010	31/08/2017	2580	75%														

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE

SEZ. 4.1.2

REPORT QUINDICINALE N. 146

Periodo di riferimento: 16 Apr 2017 – 30 Apr 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<u>LAVORAZIONI IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO																		Lavorazione Stralciata - sarà eseguita direttamente dall'Amministrazione Comunale
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO																		Attività in corso di definizione
<u>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</u>																		Attività in corso di definizione
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS																		Attività in corso di definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN																		Attività in corso di definizione
OPERA DI SPINTA																		Attività in corso di definizione
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)																		Attività in corso di definizione

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO

SEZ. 4.1.3

REPORT QUINDICINALE N. 146

Periodo di riferimento: 16 Apr 2017 - 30 Apr 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
ASSEMBLAGGIO FRESA	31/08/2015	25/10/2015	55	100%														
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON ATTRAVERSAMENTO A PIENO)	02/05/2017	18/11/2017	200															Attività in corso di definizione
MANUTENZIONE FRESA																		
SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE																		
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)																		
MANUTENZIONE FRESA																		
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE																		
SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA																		

■ ATTIVITA' REALIZZATA

■ ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA

SEZ. 4.1.4

REPORT QUINDICINALE N. 146

Periodo di riferimento: 16 Apr 2017 – 30 Apr 2017

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2017	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-28 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE RASTRIGLIA - FASE A	05/02/2017	28/03/2017	51															
CANTIERI AREE N.3-4	25/03/2017	22/04/2017	29															
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)	20/04/2017	15/07/2017	87															
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI	15/05/2017	25/07/2017	72															
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI	26/07/2017	27/08/2017	33															
CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE CAVANIGLIA - FASE A	05/02/2017	28/03/2017	51															
CANTIERI AREE N.1-2	22/02/2017	13/04/2017	51															
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE	20/03/2017	17/05/2017	59															
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI	10/05/2017	29/06/2017	51															
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI	30/06/2017	28/07/2017	29															

ATTIVITA' REALIZZATA
 ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

- Sotto il Solaio Fili 3-5, sono stati eseguiti i tagli delle platee per l'appoggio dei puntelli del banchinaggio (Foto 1);
- Sul Ventaglio Asse 9, è in via di completamento la rimozione del banchinaggio (Foto 2);
- Sotto le travi cuscino del Ventaglio Asse 17 è in corso il carteggio delle travi (Foto 3);
- Sul Ventaglio Asse 33 prosegue il montaggio delle armature e dei casseri delle travi lato Ovest ed Est ed è stato eseguito il getto degli sbalzi del Fondo Cassone (Foto 4);
- Sui Diaframmi lato Est della Testata Sud è stato completato il montaggio dell'armatura del cordolo di testa (Foto 5);
- Sulla Testata Sud prosegue il banchinaggio e la posa dell'armatura del Solaio livello 00 (Foto 6);
- Tra il filo 34 ed il filo 35, dal lato Est, sono stati rimossi i casseri della Trave denominata "TPT01" che separa la Testata Sud dal Ventaglio 33 (Foto 7);
- Sulla Rampa Kiss & Ride è stata gettata la trave denominata "T.01.C02B", e proseguono i getti del fascione per l'alloggiamento dell'impianto d'illuminazione sul muro MU10 (Foto 8);
- In prossimità del filo 13 lato Est prosegue l'attività di ripristino del copriferro della Trave cuscino per la risoluzione di varie NC, successivamente è previsto il rinterro delle suddette zone;



Foto 1 – Taglio platee per appoggio Puntelli dei Banchinaggi, Solaio fili 3-5



Foto 2 – Rimozione Puntelli e Banchinaggi, Ventaglio Asse 9



Foto 3 – Carteggio Travi cuscino, Ventaglio Asse 17



Foto 4 – Getto Sbalzi Fondo Cassone, Ventaglio Asse 33



Foto 5 – Montaggio armatura Cordolo di testa Diaframmi Lato Est, Zona T. Sud



Foto 6 – Banchinaggio e Montaggio armatura Solaio liv. 00 Testata Sud - lato Est



Foto 7 – Scassero Trave TPT01 Testata Sud - lato Est



Foto 8 – Montaggio armatura, casseratura e getto Trave T.01.C02B, Rampa Kiss&Ride



Foto 9 – Panoramica da Sud

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette

- A Campo di Marte sono in corso le consuete operazioni di mantenimento e controllo della TBM;
- Allo Scavalco sono in corso le attività per la risoluzione delle NC184 e 185 (Foto 1);
- A Campo di Marte sono in corso le attività propedeutiche alla realizzazione della fondazione per la posa delle barriere antirumore per la schermatura del nastro (Foto 2);
- Nei pressi del Pozzo Nord è stata realizzata la fondazione per l'appoggio della Scala Ponteggio per l'accesso al Pozzo (Foto 3);
- In via Reginaldo Giuliani è stata sistemata l'area nella zona dell'edificio demolito (Foto 4).



Foto 1 – Risoluzione NC184 e 185 – Area Ex Scavalco



Foto 2 – Opere propedeutiche fondazione barriere antirumore – Area Campo di Marte



Foto 3 – Realizzazione Fondazione per appoggio Scala Ponteggio per l'accesso al Pozzo



Foto 4 – Sistemazione area edificio demolito in via Reginaldo Giuliani

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE	PERIODO		AUT. GIÀ RICHIESTA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENT. PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2 - ST	Via Circondaria	disfrenarsi	occupazione suolo pubblico	già attiva	-	SI	SI	SI	restituzione area a fine lavori	
Lotto 2 - PA	MUGNONE - Via Cassiana	sbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico			NO	NO		durata prevista 12 mesi	
Lotto 2 - PA	MUGNONE - Viale Rialdi	sbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico			NO	NO		durata prevista 18 mesi	
Lotto 2 - ST	Vale Corsica	via di fuga	passo carabile	01/09/2011	30/12/2017	SI	SI		restituzione area a fine lavori	Allegato n.1
Lotto 2 - PA	Vale Strozz - Giardini Fortezza da Basso	Realizzazione Trincea 1 per compensazioni grouting	occupazione / alterazione suolo pubblico e richiesta ordinanza alla mobilità	gen-17	set-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Vale Strozz - Fossato Fortezza da Basso	Realizzazione Trincea 2 per compensazioni grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	gen-17	set-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Vale Strozz	Realizzazione Trincea 3 per compensazioni grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	gen-17	set-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Vale Strozz - Parcheggio Binario 15	Realizzazione Trincea 4 per compensazioni grouting	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	dic-17	SI	NO			
Lotto 2 - PA	Vale Strozz - Parcheggio Binario 15	Spostamento vancò in uscita dal parcheggio - piazzole Montalungo	occupazione / alterazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	gen-17	feb-17	SI	NO		Durata Lavoro prevista 1 mese	
Lotto 2 - PA	Vale Strozz	BOE in valle Strozz e Piaforma tra le Trincee 3 e 4	occupazione / alterazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	gen-17	feb-17	SI	NO		Durata Lavoro prevista 3 settimane con modifica all'esercizio viario	
Lotto 2 - PA	Vale Strozz - Fossato Fortezza da Basso	Piaforma tra le Trincee 3 e 4	occupazione / alterazione suolo pubblico	gen-17	set-17	SI	NO		Durata Lavoro prevista 2 settimane	
Lotto 2 - PA	Via Reginaldo Giuliani 159	Demolizione fabbricato	prima richiesta occupazione suolo pubblico e richiesta di ordinanza alla mobilità	dic-16	dic-16	SI	SI (Provvedimento Direzionale n° 2016/M.08485 e MCGI-3379-2016)		L'attività è stata realizzata di notte	
Lotto 2 - PA	Via Reginaldo Giuliani 159	Demolizione fabbricato	Proroga del Provvedimento Direzionale n° 2016/M.08485 e MCGI-3379-2016 occup. suolo pub. e passo carr. prov.	gen-17	apr-17	SI	SI		proroghe fino alla data 16.04.2017	
Lotto 2 - PA	Via Frià Bandinello	Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Vale S. Lavagnini	Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Fortezza da Basso	Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE	
Lotto 2 - PA	Via Delle Ghiacciaie	Sondaggio SP6	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Vale Corsica	Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE e Sondaggio	
Lotto 2 - PA	Via del Terzole	Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	feb-17	apr-17	SI	SI		Eseguita BOE	
Lotto 2 - PA	Via Frià Bandinello	Proroga Sondaggio SP2	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	Proroga Sondaggio SD3	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Vale S. Lavagnini	Proroga Sondaggio SP4	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	NO		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Fortezza da Basso	Proroga Sondaggio SD5	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Via Delle Ghiacciaie	Proroga Sondaggio SP6	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Vale Corsica	Proroga Sondaggio SD9	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	Via del Terzole	Proroga Sondaggio SP10	occupazione ed alterazione suolo pubblico	apr-17	mag-17	SI	SI		per le necessarie analisi	
Lotto 2 - PA	da Campo di Maria a Piazza della Libertà	Capiscidi per monitoraggio	Occupazione permanente di suolo pubblico	mar-17	mar-17	SI	SI	NO	in attesa di parere del Comune di Firenze	

Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica



4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

Ente per rilascio autorizzazione	CANTIERE	TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE	AUT. GIÀ RICHIESTA	DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA	PERIODO		NOTE
						INIZIO	FINE	
PROVINCIA DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITÀ DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 288NV-14 del 26.3.2014
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITÀ DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	29/01/2014	31/12/2023	Richiesta implementazione con nota n. 288NV-14 del 26.3.2014
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI RICHIESTA	SI	11/11/2010	SI	20/12/2015	20/12/2019	
REGIONE TOSCANA Genio Civile	POZZO NORD	AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	17/11/2015	SI	01/01/2016	31/12/2016	richiesta di rinnovo del 07/06/2016 nota NV2497NV-16
AATO 3	POZZO NORD	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI RICHIESTA	SI	11/11/2010	SI	30/08/2012	30/08/2016	
REGIONE TOSCANA Genio Civile	PASSANTE AV	AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	17/11/2015	SI	01/01/2016	31/12/2016	richiesta di rinnovo del 07/06/2016 nota NV2497NV-16
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANTI	SI	17/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	PER AREA CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "A", CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "B", AREA EX CENTRALE DEL LATTE, AREA EX MACELLI, AREA BELFIORE
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	18/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANTI	SI	03/11/2011	SI	17/12/2012	17/12/2016	
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA Nuovi POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA PER LA CONTINUITÀ DI FALDA	SI	27/03/2015	SI	27/03/2015	27/03/2016	
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	18/11/2016	SI	25/11/2016	28/02/2017	proroga 2016/DD/08663
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	20/01/2017	SI	01/03/2017	31/12/2017	Provvedimenti Dirigenziali 2017/DD/01203 e 2017/DD/01341
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	AUT. PERFORAZIONE POZZO M4	SI	05/05/2016	SI	05/05/2016	05/11/2016	Domanda di Concessione e aumento di portata del 30/11/2016 nota 5645NV-16
REGIONE TOSCANA	PASSANTE AV	AUT. PERFORAZIONE POZZO OPD FORTEZZA DA BASSO	SI	11/02/2016	SI	08/06/2016	05/12/2016	Decreto dirigenziale 12505
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	02/03/2016	SI	22/07/2016	31/12/2016	Provvedimento Dirigenziale 2016/DD/05261
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Cantiere fresa Campo di Marte	RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE	SI	16/03/2016	SI	15/05/2017	31/12/2020	Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/02699 del 13/04/2017
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Fortezza da Basso	DEROGA AL RUMORE	SI	22/07/2016	SI	26/08/2016	22/08/2017	Provvedimento Dirigenziale 2016/DD/05009 del 12/04/2017
COMUNE DI FIRENZE	PASSANTE AV - Fortezza da Basso	RICHIESTA DI PROROGA PER DEROGA AL RUMORE	SI	22/03/2016	SI	22/08/2017	31/08/2018	Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/02633
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Domanda di Concessione per aumento portata di falda MV1-MV2-MV3	SI	21/07/2016	NO			In seguito a riunione con il G.C. del 22/11/2016, è stata rimessa nuova richiesta con nota 5530NV-16 del 24.11.2016
REGIONE TOSCANA	PASSANTE AV	Domanda di Concessione per aumento portata di falda WIW2-WIW3	SI	21/07/2016	NO			In seguito a riunione con il G.C. del 22/11/2016, è stata rimessa nuova richiesta con nota 5530NV-16 del 24.11.2016
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV5	SI	21/07/2016	SI	17/02/2017	31/12/2016	Pratica 3985
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV6	SI	21/07/2016	SI	17/02/2017	31/12/2026	Pratica 3986
REGIONE TOSCANA	STAZIONE AV	Concessione di acque pubbliche pozzo MV7	SI	21/07/2016	SI	17/02/2017	31/12/2026	Pratica 3987
SUAP Firenze	STAZIONE AV - PASSANTE AV	Richiesta di proroga per scarichi Campo di Marte e Stazione (meteoriche ed industriali) AUT. 188, 169, 170, 171, 172, 200,177 e 309.	SI	09/09/2015 prof. 2447NV-15 richiesta di rinnovo alle aut. in scadenza.	solo rinnovo ex AUT. 177, per le altre ci avvaliamo della proroga trasmessa con nota 3794NV-16 del 29/08/2016	aut. P.G. 48638 del 20/12/2015	al 20/12/2019	Rinnova autorizzazione ex 177 con nuova aut. Comune di Firenze P.G.48638 del 17/02/2016. Per le altre autorizzazioni è stato sollecitato il SUAP del Comune di FI con note 3085NV-16 del 27/7/2016 e 3794NV-16 del 29/08/2016.
SUAP Cavriglia	Santa Barbara	scarico acque reflue su corpo idrico superficiale (AMD, colina schermo e cantiere logistico).	SI	09/09/2016 domanda di rinnovo al SUAP Comune di Cavriglia (AR)	SI	31/08/2013	31/08/2017	Richiesta di proroga alla trasmissione della documentazione integrativa in seguito agli esiti istruttorie sul Piano di Urbato Terre
SUAP Firenze	Stazione	Richiesta AUA per rinnovo scarichi AMD su terreno Mugnone	SI	08/09/2016	NO	17/04/2013	17/04/2017	Rinnova l'aut. 1427. Nostra nota prot. n. 3705NV-16
Regione Toscana Genio Civile Arezzo	Santa Barbara	Richiesta attingimento acque superficiali	SI	12/09/2016	SI	29/09/2016	31/12/2016	da richiedere nuova autorizzazione per il 2017
Regione Toscana Genio Civile Arezzo	Santa Barbara	Richiesta attingimento acque superficiali	SI	27/01/2017	NO	01/01/2017	31/12/2017	richiesta attingimento nota prot. 397NV-17
Regione Toscana Genio Civile Firenze	Ex Scavalco	Richiesta aggotamento acque superficiali finalizzata all'abbassamento del livello di falda	SI	10/10/2016	SI	03/03/2017	31/12/2017	Pratica n. 1309
SUAP Firenze	Passante AV	Richiesta AUA per rinnovo modifica sostanziale scarichi AMD ed industriali aut. P.G. 48638 del 17/02/2016	SI	07/11/2016	NO			Richiesta di modifica presentata in data 07/11/2016 con nota 5109NV-16

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE
<i>aggiornamento 30/04/2017</i>
<i>ditte</i>
3B MUST S.r.l.
AMDP S.r.l.
CAF S.c.r.l.
COLABETON S.p.A.
GAVAZZI MAURO S.r.l.
GIGLIO Servizi Ambientali e Bonifiche S.r.l.
ME.MO.FER. S.r.l.
NODAVIA S.c.p.A.
PICCINI AUTOTRASPORTI S.r.l.
PIZZI TERRA S.r.l.
SOF S.p.A.
TECNOLAB S.r.l.
TECNOSIDER S.r.l.
PIANA GRU S.r.l.
TAGLIO PERFORAZIONE CEMENTO S.r.l.

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE
<i>aggiornamento 30/04/2017</i>
<i>ditte</i>
ERGON S.c. a r.l.
MOSCONI S.r.l.
NODAVIA S.c.p.A.
PIZZI TERRA S.r.l.
SOF S.p.A.
MATEC S.r.l.
TECHNOSOIL S.r.l.
