



Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri al 25 settembre 2024




25 settembre 2024

Stato di avanzamento opere

Galleria pari

- Scavati 1.588m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

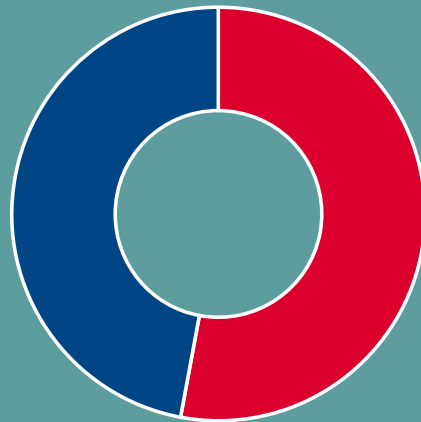


■ Scavato ■ Da scavare

✓ 53%

Galleria dispari

- Scavo non avviato

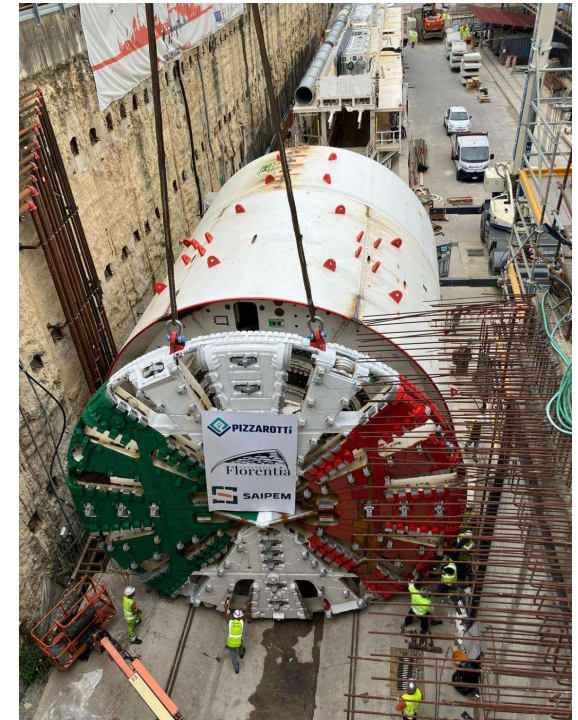

Seconda TBM per lo scavo della galleria Binario Dispari

Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 25 settembre 2024

Stato di avanzamento della fresa Iris



Stato di avanzamento opere

Stazione AV

Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Pozzo nord

Santa Barbara

- Stesi circa 89.760 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo




Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali

Campo di Marte

In corso interventi di montaggio della seconda fresa e attività di trasporto e scarico conci

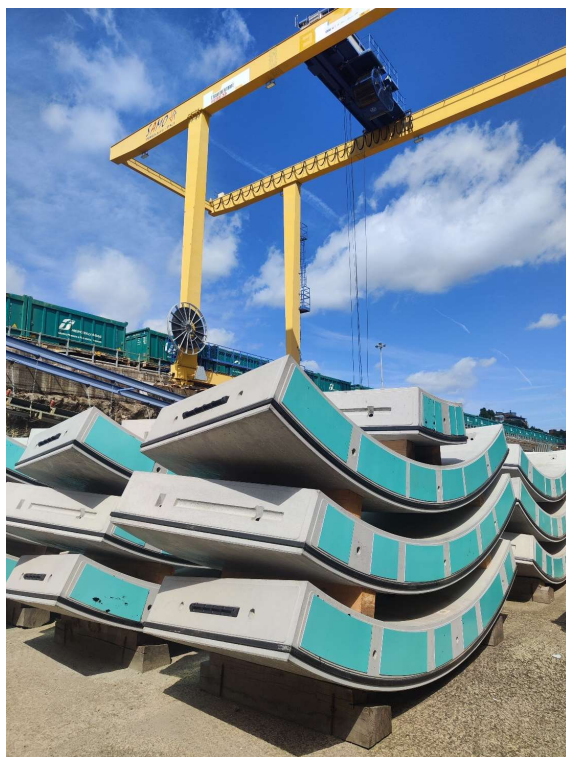

Santa Barbara

Avviato il conferimento delle terre provenienti dallo scavo del Passante AV



Stato di avanzamento cantieri


Cantieri principali

Stazione AV



- In corso la posa di casseratura, armatura e getti dei solai di testata nord e sud e delle travi cuscino
- In considerazione dell'interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di treni per il conferimento delle terre a S. Barbara

Scavo di approfondimento

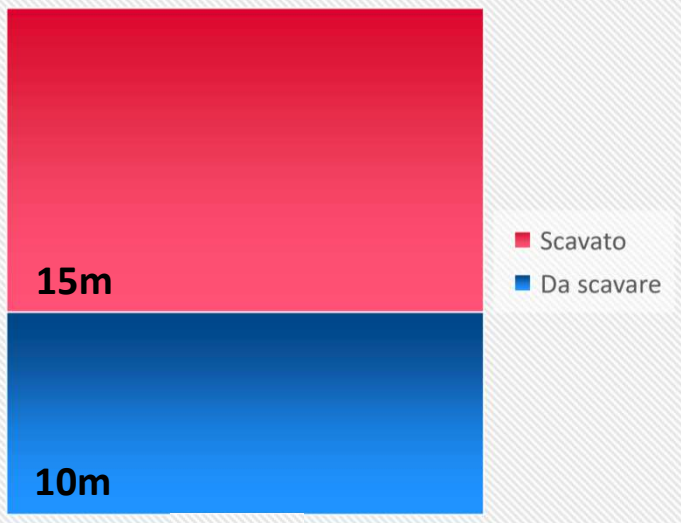


60%

Pozzo nord

In corso le attività di consolidamento propedeutiche alla realizzazione della galleria policentrica

Pozzo sud

Temporaneamente sospese le attività di cantierizzazione propedeutiche alla realizzazione del pozzo

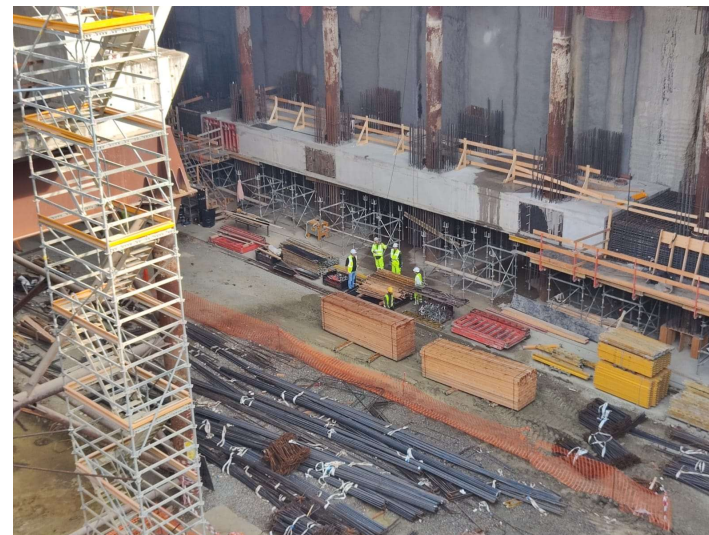

Cantiere della Stazione AV

Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 25 settembre 2024

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Fortezza da Basso
- ❑ Aree 1-4: completate le perforazioni per il *compensation grouting* e avviate le iniezioni
- ❑ In corso le attività di *jet grouting*



Area 4



Area 1



Area 1 estesa
Jet grouting



Area 3


Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 25 settembre 2024

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Via Cittadella: sono in corso le perforazioni e le iniezioni per i consolidamenti
- Via delle Ghiacciaie: in corso le perforazioni e le iniezioni per il consolidamento degli edifici 29 e 35

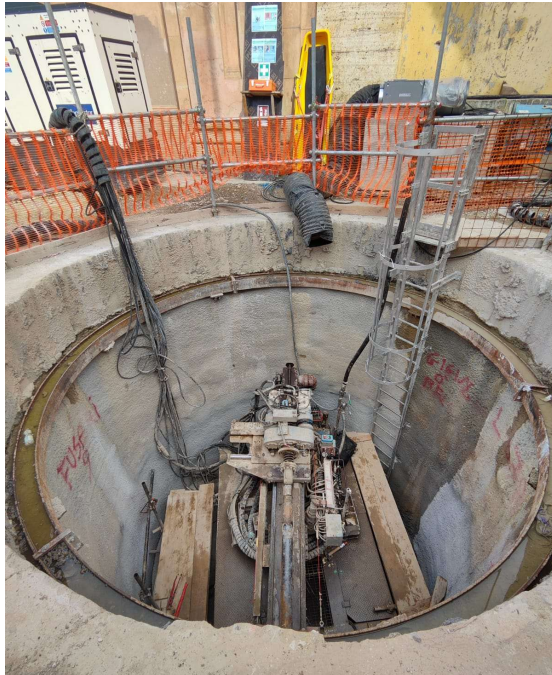

Via Cittadella



Via delle Ghiacciaie

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Viale Redi: sono in corso di valutazione alcuni interventi di salvaguardia dell'edificio
- Scuola Ottone Rosai: intervento di consolidamento concluso. Sono state avviate le operazioni di ripristino delle aree
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze



Cantiere Ottone Rosai

Grazie

