

Verbale sopralluogo

Cantiere Via Cittadella

Data 29/05/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Polagruto, Osmani, Randazzini
- Committente – RFI: Guarnieri, Caruana, Del Bimbo
- Direzione Lavori – Italter: D'Eugenio
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti, Pagliarini

Ordinanze e concessioni

- Ordinanza: 6526 del 20/09/2000
- Mobilità: 3046/2023 15/05/2023
 - Inizio 22/05/2023
 - Fine 14/06/2024
- Acustica: DD/2024/03142
 - Inizio 22/04/2024
 - Fine 28/02/2025

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edifici che si affacciano su via Cittadella mediante il metodo jet-grouting, allo scopo di ridurre il livello di rischio potenziale attraverso iniezioni di miscele cementizie da un apposito pozzo di allettamento (realizzato tramite una trivella montata sul posto), con al suo interno il macchinario per effettuare le perforazioni.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Sono stati realizzati i pali del perimetro del pozzo ed è stata completata la prima fase dello stesso per una profondità di - 4,20 m dal p.c. **(foto nr.1)**. Effettuate le prime 4 perforazioni di prova, a circa 2 m dal p.c. Per il monitoraggio di probabili sollevamenti durante la fase di consolidamento e probabili assestamenti durante il passaggio del TBM, sono stati installati dei mini prismi nelle strutture esterne degli edifici 22 e 24 **(foto nr.2)**.

Cronoprogramma

Mese	Maggio 2024				Giugno 2024				Luglio 2024				Agosto 2024			
Settimana	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Sistemazione macchine																
Realizzazione pozzo																
Installazione macchinario per il compestation																
Perforazioni																
Immissione																
Ripristino																

Note aggiuntive

L'appaltatore è in attesa del rilascio della proroga della ordinanza di mobilità per le lavorazioni inerenti al completamento del pozzo, la realizzazione delle perforazioni e le successive iniezioni in cls.

Il cantiere non si prefigura come area compensation grouting durante lo scavo delle gallerie: terminate le iniezioni di consolidamento il cantiere verrà smantellato e l'area riportata allo stato originario.



Foto nr.1

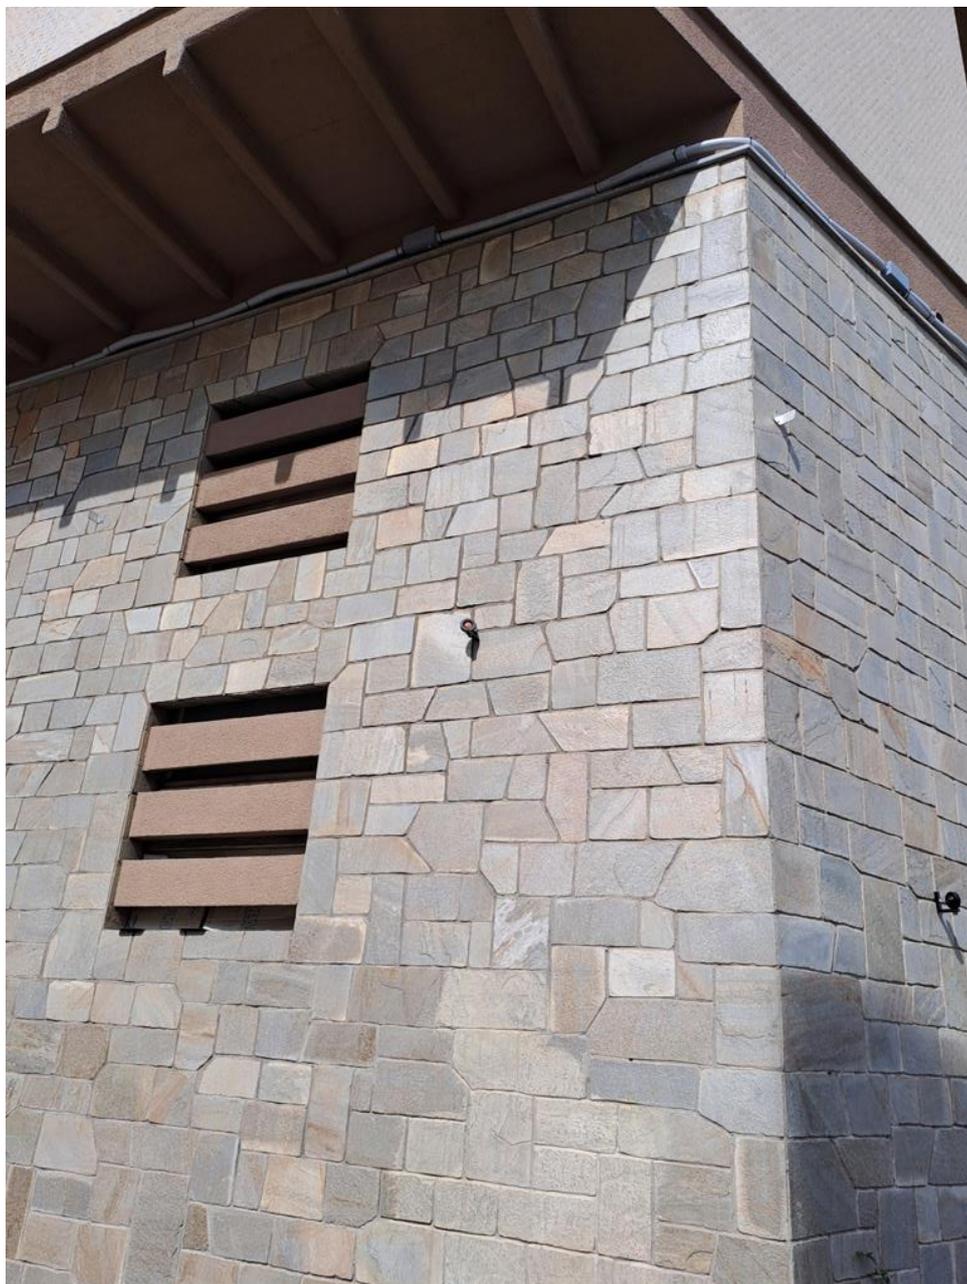


Foto nr.2
