



# Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

*Stato di avanzamento opere e cantieri al 5 giugno 2024*




# Stato di avanzamento opere

## Galleria pari


➤ Scavati 873m di circa 3000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

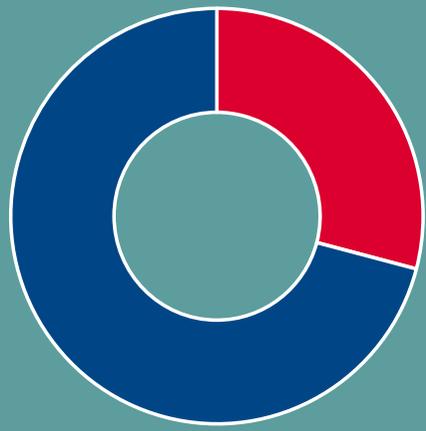

■ Scavato ■ Da scavare


✓ 29%

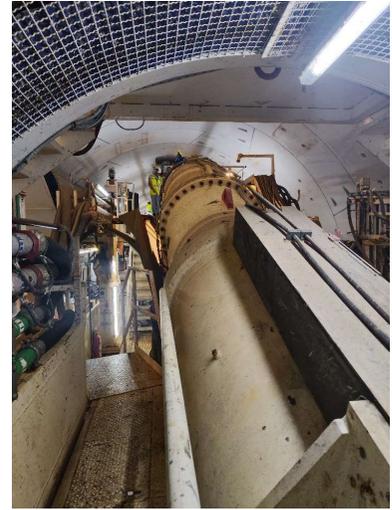

## Galleria dispari

➤ Scavo non avviato

# Stato di avanzamento della fresa Iris

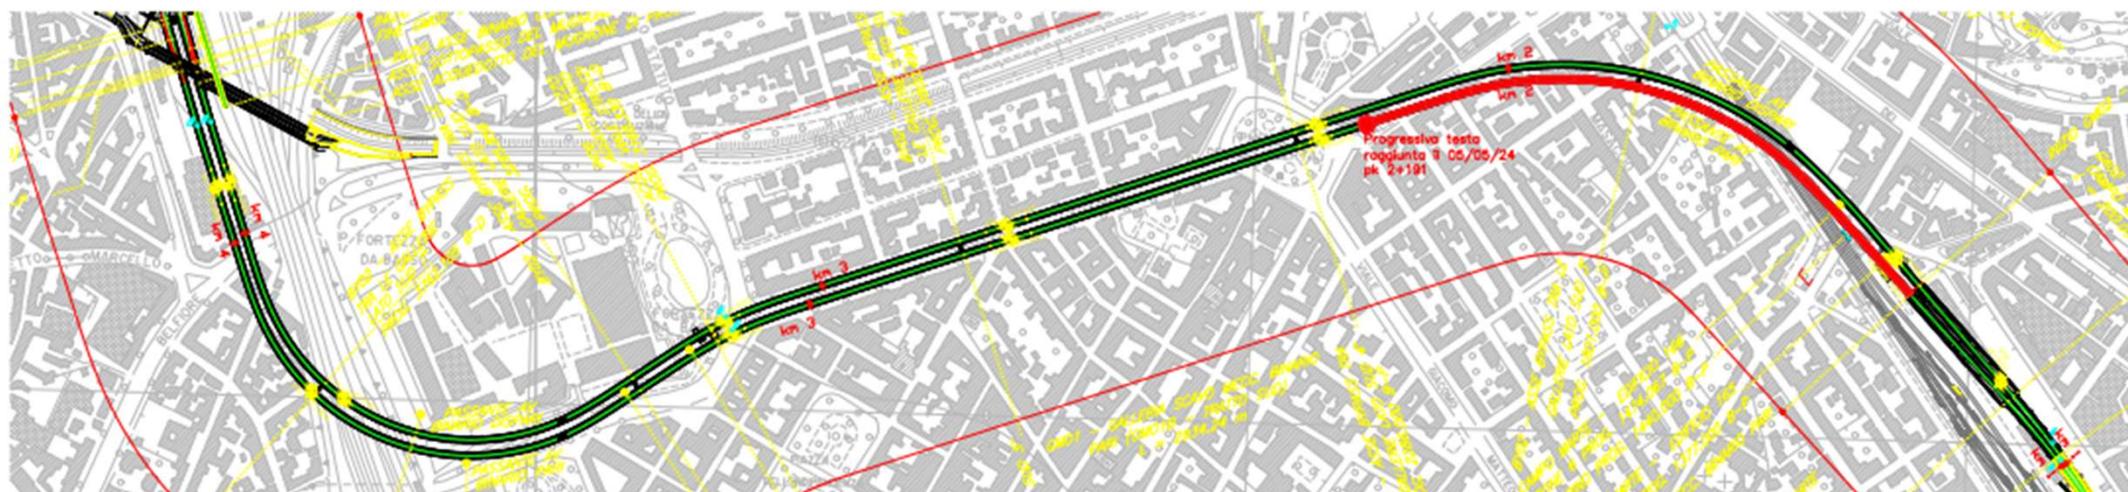

# Stato di avanzamento opere

## Stazione AV

### Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Pozzo nord



## Santa Barbara

- Stesi circa 63.000mc di materiale per la realizzazione della collina schermo



# Stato di avanzamento cantieri

## Cantieri principali

### Campo di Marte



In corso interventi di montaggio della seconda fresa e attività di trasporto e scarico concii



### Santa Barbara



Avviato il conferimento delle terre provenienti dallo scavo del Passante AV


# Stato di avanzamento cantieri

## Cantieri principali


### Stazione AV



È in corso la dismissione dell'impianto cantiere per l'esecuzione dei pali integrativi. In considerazione dell'interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di treni per il conferimento delle terre a S. Barbara.

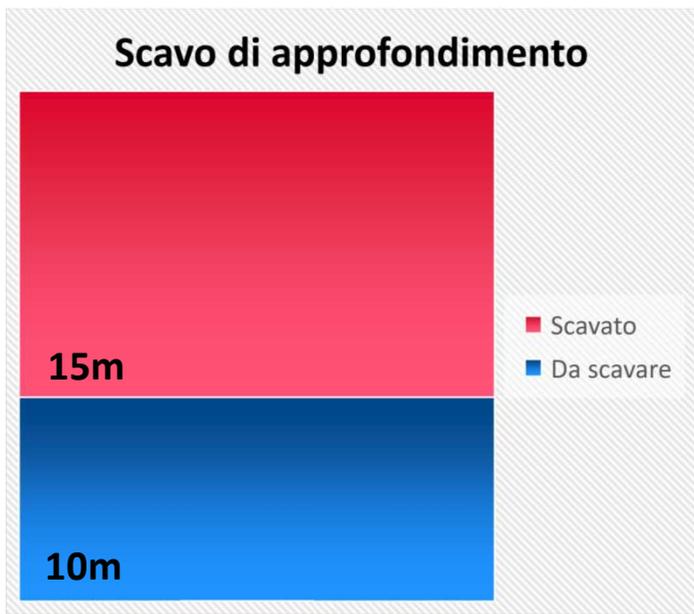

60%

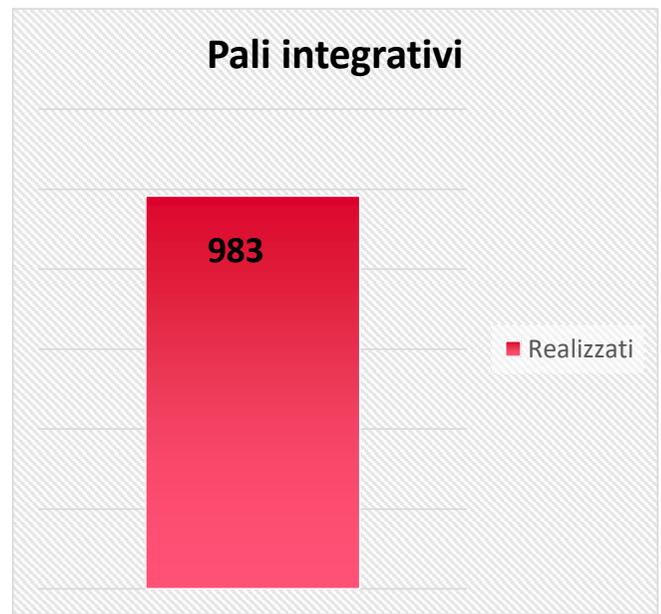

100%

# Stato di avanzamento cantieri

## Cantieri secondari

- Fortezza da Basso
- ❑ Aree 1-2-3-4: sono in corso le perforazioni per il *compensation grouting*;
- ❑ Sono in corso le attività di cantierizzazione per l'estensione del cantiere dell'area 1 al fine di eseguire gli interventi connessi al pozzo di aggotamento acque di galleria.



Area 1



Area 2



Area 3



Area 4


# Stato di avanzamento cantieri

## Cantieri secondari

- Via Cittadella: avviate le perforazioni per gli interventi di consolidamento.
- Via delle Ghiacciaie: completate le attività di Bonifica Ordigni Bellici nell'area dell'edificio 29; in attesa dell'ordinanza comunale per la configurazione definitiva del cantiere. Avviate le perforazioni per il consolidamento dell'edificio 35.



Via Cittadella – perforatrice

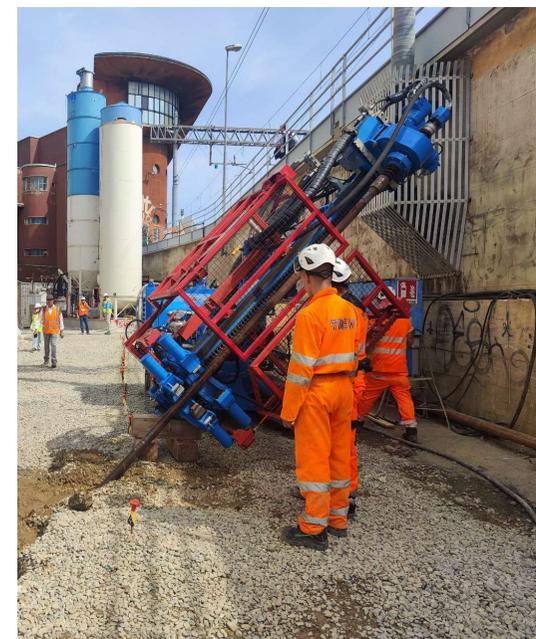

Via delle Ghiacciaie - perforazioni

# Stato di avanzamento cantieri



## Cantieri secondari

- Viale Redi: sono in corso di valutazione alcuni interventi di salvaguardia dell'edificio.
- Scuola Ottone Rosai: sono in corso le attività di cantierizzazione per l'avvio degli interventi di consolidamento, da eseguirsi durante l'estate 2024 in ottemperanza alle prescrizioni fornite dall'Osservatorio Ambientale.
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze.



Cantiere scuola Ottone Rosai

**Grazie**

