



Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri al 14 febbraio 2024



14 febbraio 2024

Stato di avanzamento opere

Galleria pari


- Scavati 465m di circa 3000m nel tratto Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 15%

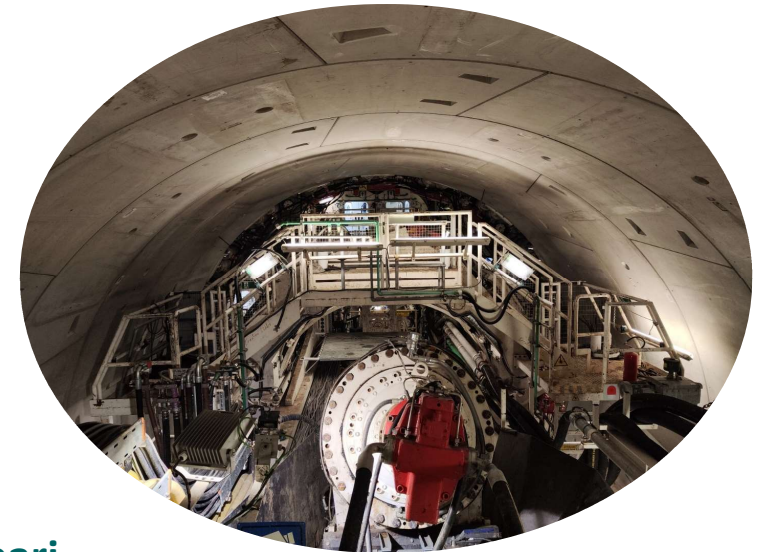


Galleria dispari

- Scavo non avviato

Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 14 febbraio 2024

Stato di avanzamento della fresa Iris

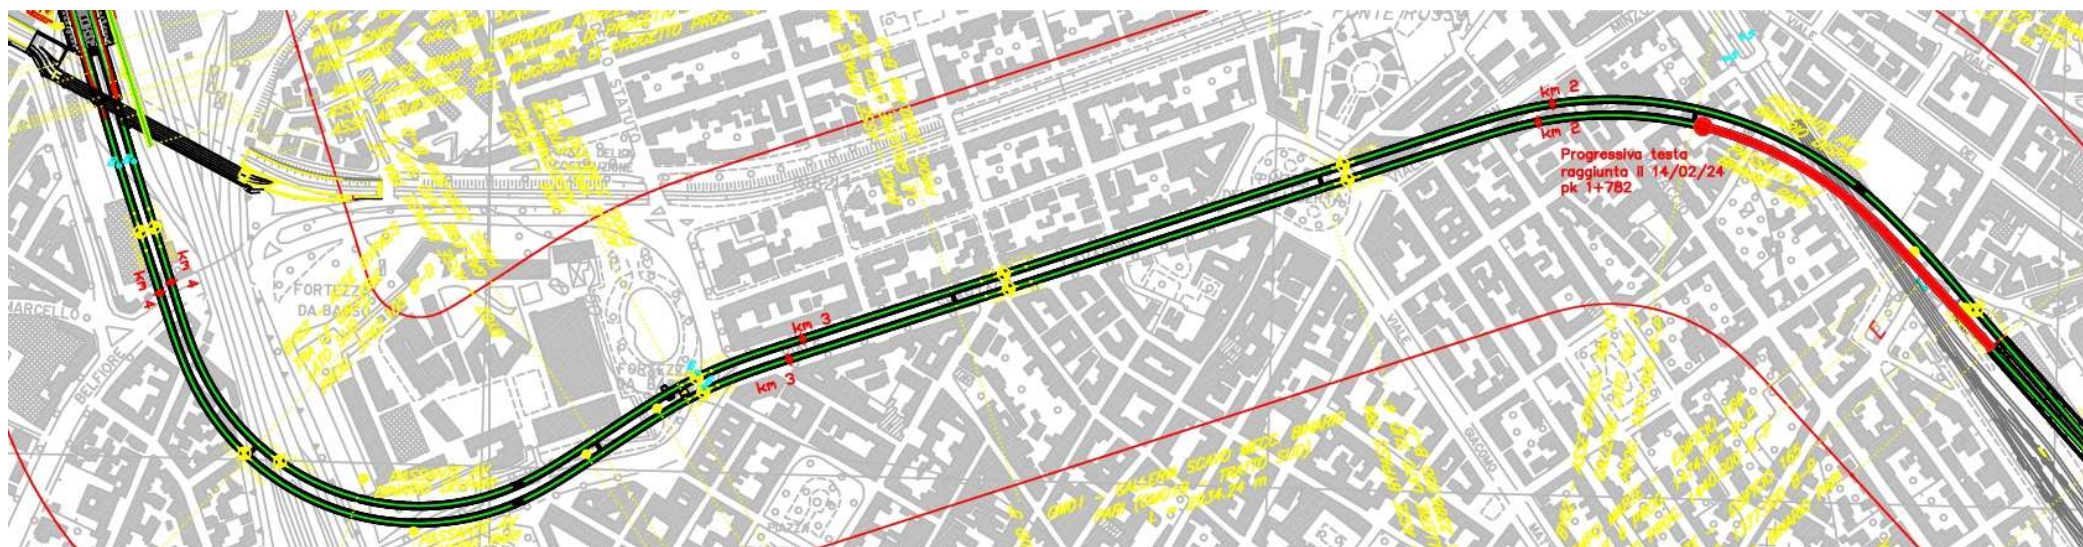

Stato di avanzamento opere

Stazione AV


Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Pozzo nord



Santa Barbara

- Stesi circa 60.000mc di materiale per la realizzazione della collina schermo

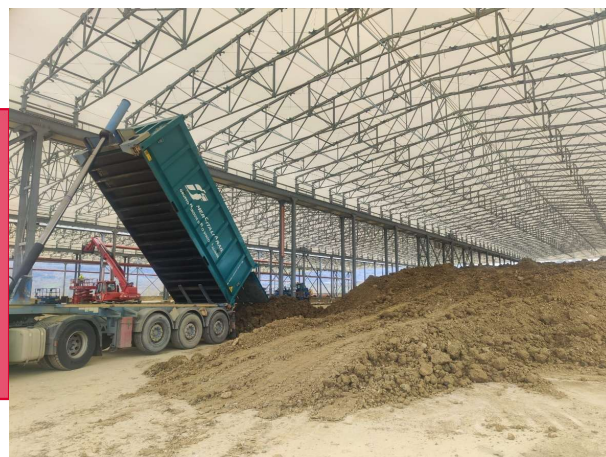



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali

Campo di Marte



In corso interventi di cantierizzazione propedeutici all'arrivo della seconda fresa e attività di trasporto e scarico conci.

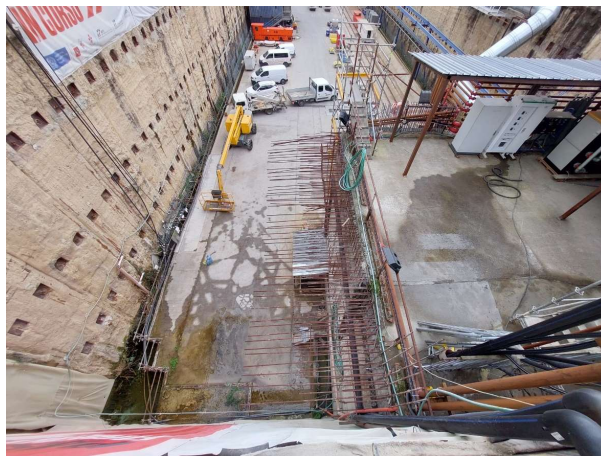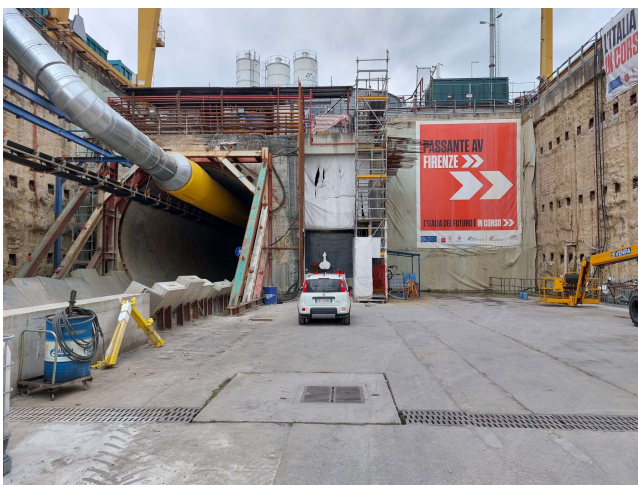

Santa Barbara



In corso attività di implementazione baie, coperture per la ricezione dei materiali di scavo delle gallerie, adeguamento dell'Impianto di Trattamento Acque (ITA) e della vasca di raccolta acqua

Stato di avanzamento cantieri


Cantieri principali

Stazione AV





In corso attività di trivellazione pali integrativi e getto, fornitura carpenterie metalliche per le strutture orizzontali del camerone.

In considerazione dell'interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di treni per il conferimento delle terre a S. Barbara.

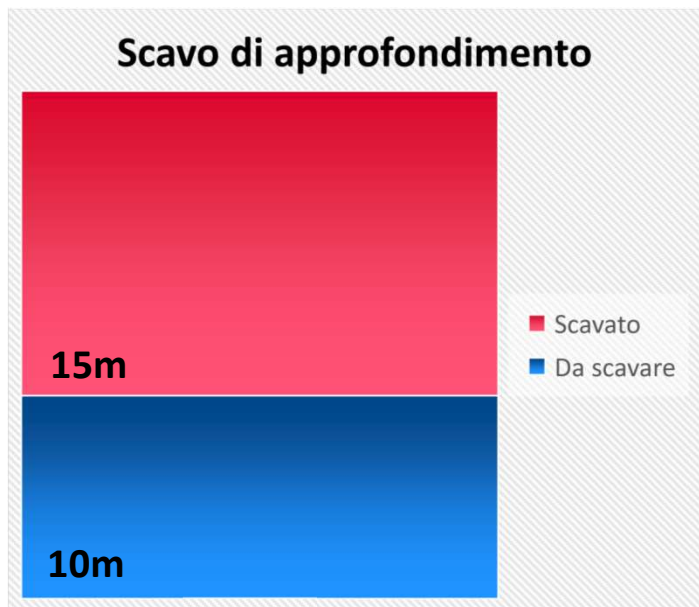

✓ 60%

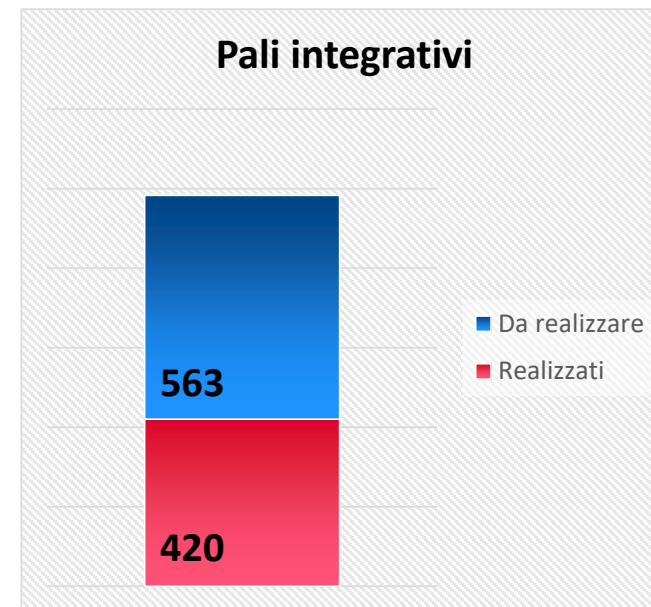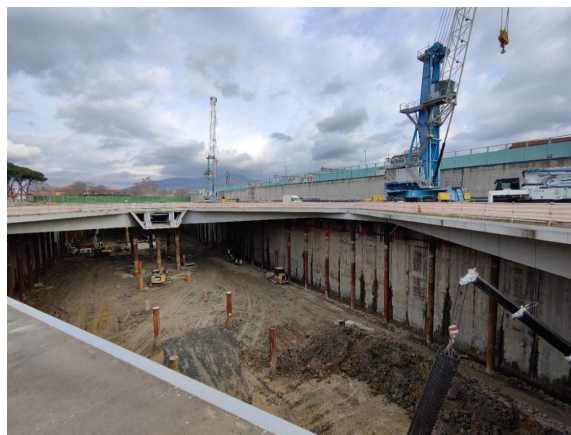

✓ 43%

Stato di avanzamento cantieri


Cantieri secondari

➤ Fortezza da Basso

- ❑ Area 1: sono in corso di completamento le perforazioni del campo prova;
- ❑ Aree 2-3-4: nessuna attività;
- ❑ Nelle prossime settimane verrà estesa la superficie del cantiere dell'area 1 per eseguire gli interventi connessi al pozzo di aggotamento acque di galleria.




Area 1

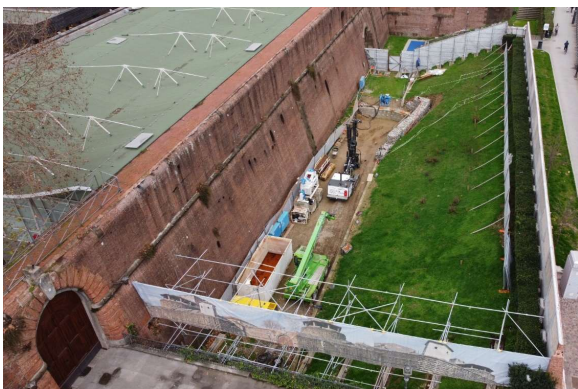

Area 2



Area 3

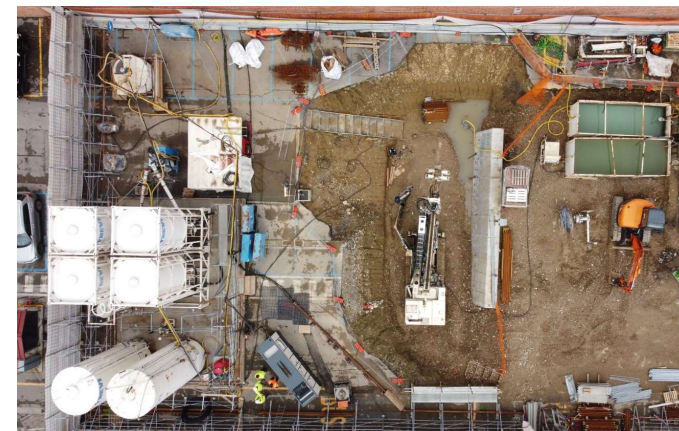

Area 4

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Via Cittadella: realizzati tutti i pali del tappo di fondo, gettata la trave guida per i pali del pozzo, che verranno realizzati appena ricevuta la nuova deroga acustica.
- Via delle Ghiacciaie: risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per l'avvio della Bonifica Ordigni Bellici.



Via Cittadella



Via delle Ghiacciaie

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Viale Redi: risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per scavo trincea.
- Scuola Ottone Rosai: nessuna attività in corso. È stata acquisita la Deroga Acustica del Comune. L'avvio delle perforazioni è prevista per l'estate 2024, come da prescrizioni ricevute.
- Via del Sodo: nessuna attività in corso. È stata acquisita l'Ordinanza del Comune (22.01.24) ed è previsto, a breve, l'avvio della cantierizzazione.



Viale Redi

Grazie

