**Tramvia di Firenze - Linea 3.2.2 - Cronoprogramma**
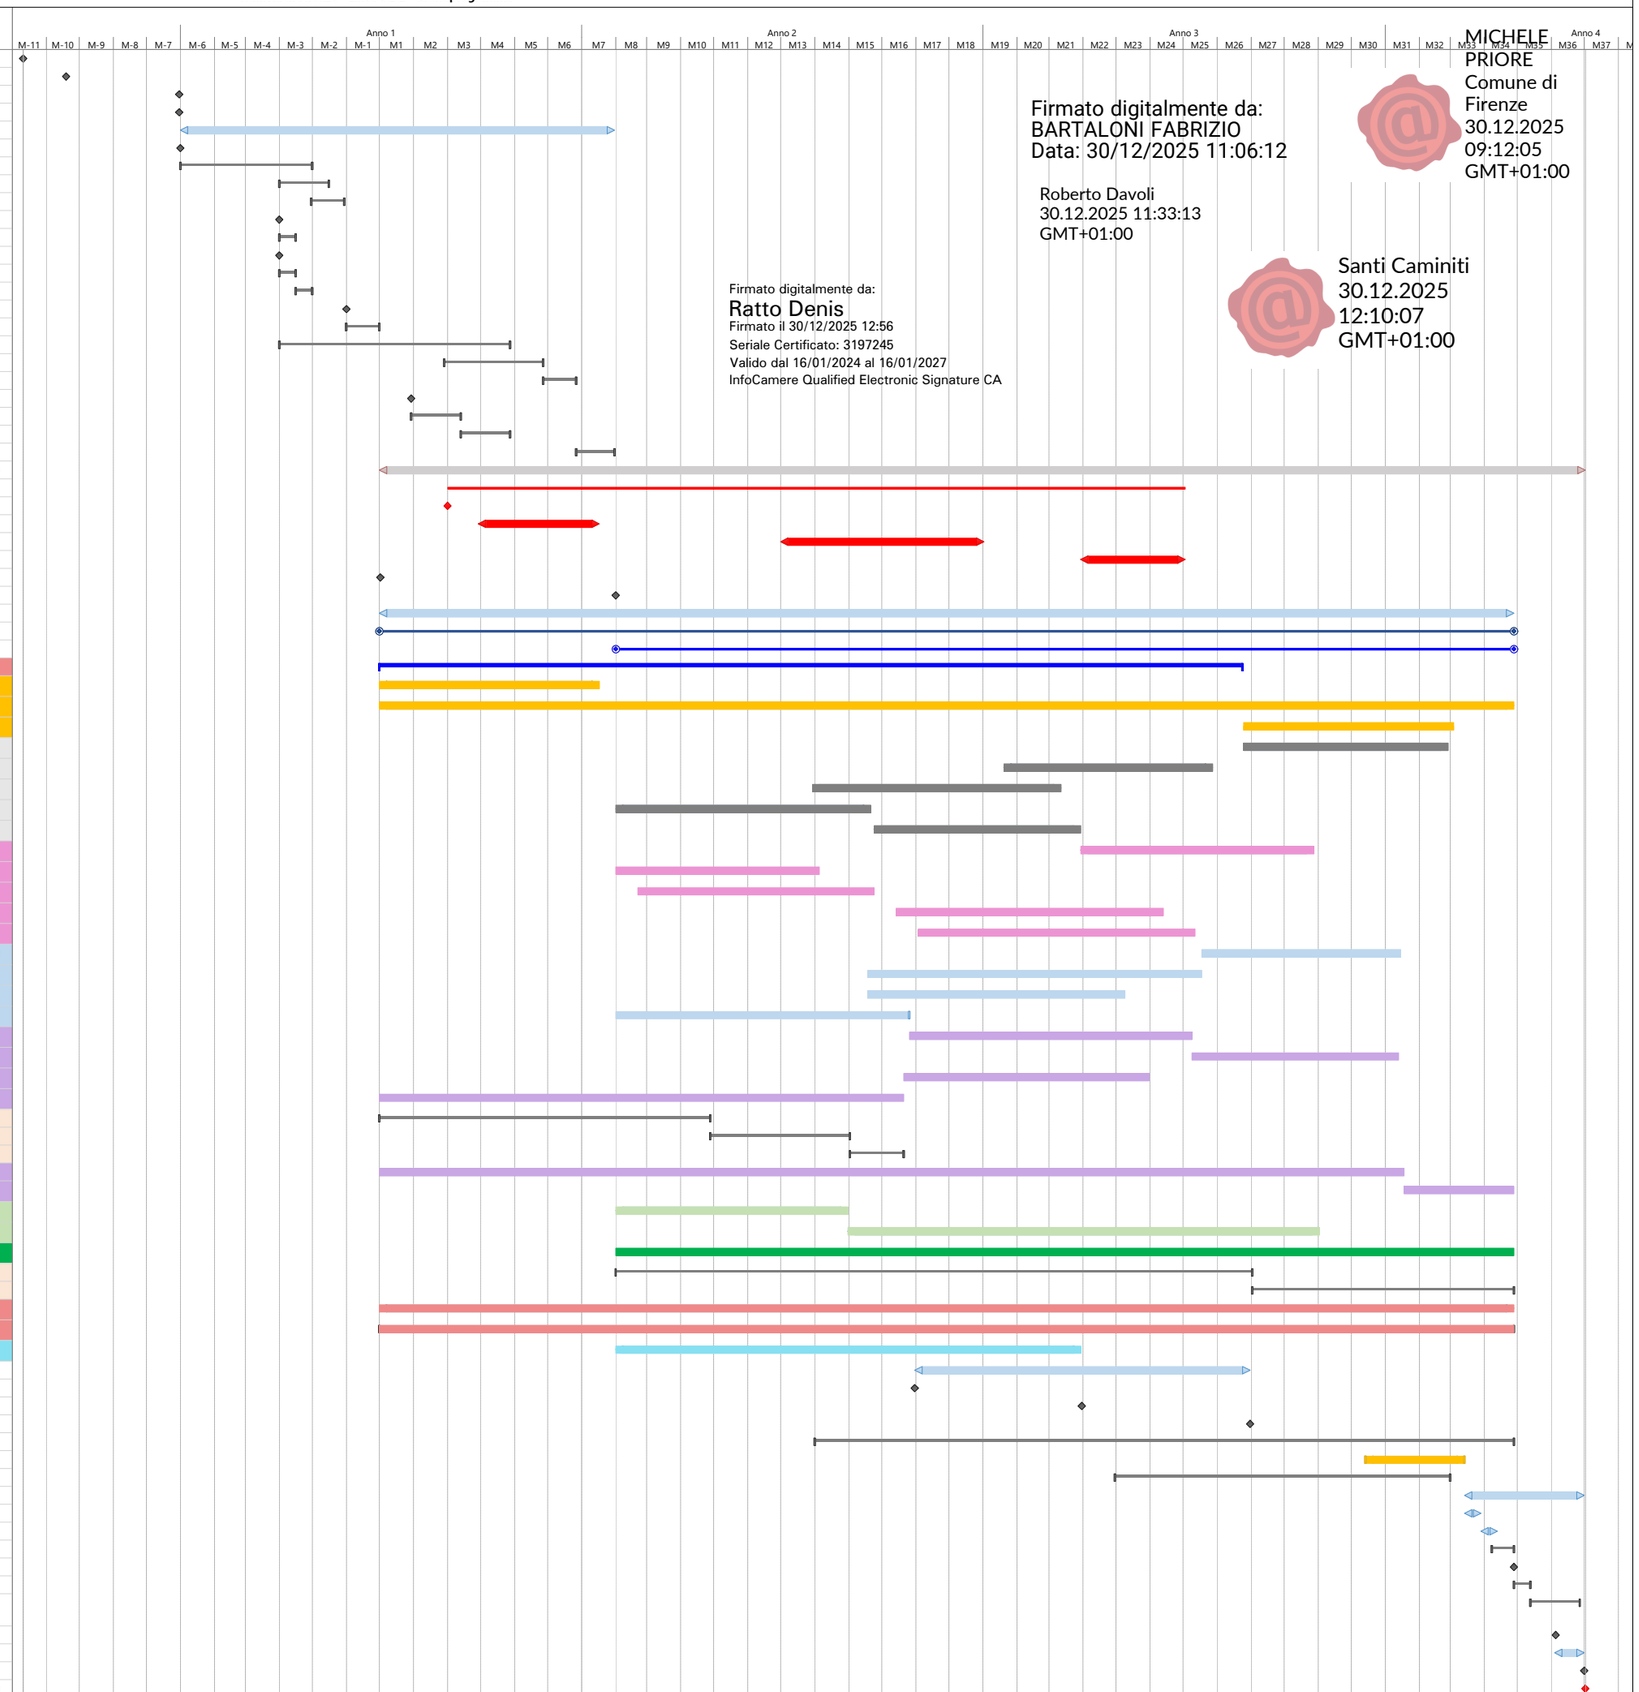
| ID | Modalità attività | Nome attività | Durata | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Approvazione Progetto Definitivo | 0 g | lun 11/08/25 | lun 11/08/25 |
| 2 | | Richiesta offerta costruzione e gestione | 0 g | ven 19/09/25 | ven 19/09/25 |
| 3 | | Ottenimento NOT del Progetto Definitivo a carico del Concedente | 0 g | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 |
| 4 | | Affidamento Progettazione Esecutiva | 0 g | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 |
| 5 | | **Attività di Progettazione e Autorizzazione** | **395 g** | **gio 01/01/26** | **sab 30/01/27** |
| 6 | | Avvio attività di progettazione | 0 g | gio 01/01/26 | gio 01/01/26 |
| 7 | | Progetto Esecutivo Fase A | 120 g | gio 01/01/26 | gio 30/04/26 |
| 8 | | Verifica PE Fase A | 45 g | mer 01/04/26 | ven 15/05/26 |
| 9 | | Approvazione PE Fase A | 30 g | gio 30/04/26 | ven 29/05/26 |
| 10 | | Trasmissione a RFI PE sottopasso Cure | 0 g | mar 31/03/26 | mar 31/03/26 |
| 11 | | Approvazione tecnica PEA e schema convenzione RFI | 15 g | mer 01/04/26 | mer 15/04/26 |
| 12 | | Trasmissione PEA ad Enti | 0 g | mar 31/03/26 | mar 31/03/26 |
| 13 | | Istruttoria Enti PEA | 15 g | mer 01/04/26 | mer 15/04/26 |
| 14 | | Recepimento eventuali osservazioni Enti su PE Fase A | 15 g | gio 16/04/26 | gio 30/04/26 |
| 15 | | Stipula convenzione RFI ed enti gestori | 0 g | dom 31/05/26 | dom 31/05/26 |
| 16 | | Attività propedeutiche all'avvio dei lavori di Fase A (ordinanze, deroghe al rumore ecc.) | 30 g | lun 01/06/26 | mar 30/06/26 |
| 17 | | Progetto Esecutivo Fase B | 210 g | mer 01/04/26 | mar 27/10/26 |
| 18 | | Verifica PE Fase B | 90 g | sab 29/08/26 | gio 26/11/26 |
| 19 | | Approvazione PE Fase B | 30 g | ven 27/11/26 | sab 26/12/26 |
| 20 | | Trasmissione PEB ad Enti | 0 g | mer 29/07/26 | mer 29/07/26 |
| 21 | | Istruttoria Enti PEB | 45 g | gio 30/07/26 | sab 12/09/26 |
| 22 | | Recepimento eventuali osservazioni Enti su PE Fase B | 45 g | dom 13/09/26 | mar 27/10/26 |
| 23 | | Attività propedeutiche all'avvio dei lavori di Fase B (ordinanze, deroghe al rumore ecc.) | 35 g | dom 27/12/26 | sab 30/01/27 |
| 24 | | **Attività di Costruzione e Pre-esercizio Linea 3.2.2** | **1097 g** | **mer 01/07/26** | **dom 01/07/29** |
| 25 | | **Vincoli RFI** | **671 g** | **mar 01/09/26** | **dom 02/07/28** |
| 26 | | **Completamento intervento RFI Ponte al Pino** | **0 g** | **mar 01/09/26** | **mar 01/09/26** |
| 27 | | **1° SLOT RFI** | **110 g** | **mar 29/09/26** | **sab 16/01/27** |
| 28 | | **2° SLOT RFI** | **185 g** | **gio 01/07/27** | **sab 01/01/28** |
| 29 | | **3° SLOT RFI** | **95 g** | **gio 30/03/28** | **dom 02/07/28** |
| 30 | | ***Consegna Area Lavori Fase A*** | **0 g** | **mer 01/07/26** | **mer 01/07/26** |
| 31 | | **Consegna Area Lavori Fase B** | **0 g** | **lun 01/02/27** | **lun 01/02/27** |
| 32 | | **Esecuzione Lavori** | **1032 g** | **mer 01/07/26** | **ven 27/04/29** |
| 33 | | ***Fase A*** | 1032 g | mer 01/07/26 | ven 27/04/29 |
| 34 | | **Fase B - tutti i lavori ad esclusione di quelli di Fase A** | 817 g | lun 01/02/27 | ven 27/04/29 |
| 35 | | **Area tecnica/stoccaggio su cantiere A1** | **785 g** | **mer 01/07/26** | **mer 23/08/28** |
| 36 | | **Cantiere A2.a - Cunicolo multiservizi - Via Berchet** | **200 g** | **mer 01/07/26** | **sab 16/01/27** |
| 52 | | **Cantiere A2.b - Sottopasso Cure** | **1032 g** | **mer 01/07/26** | **ven 27/04/29** |
| 157 | | **Cantiere A1 - V.le Don Minzoni** | **191 g** | **ven 25/08/28** | **sab 03/03/29** |
| 246 | | **Cantiere B1 - V.le dei Mille (V.Passavanti - V.Pacinotti)** | **186 g** | **ven 25/08/28** | **lun 26/02/29** |
| 340 | | **Cantiere B2 - V.le dei Mille (V.Pacinotti-V.le Marconi)** | **190 g** | **gio 20/01/28** | **gio 27/07/28** |
| 460 | | **Cantiere B3 - V.le dei Mille (V.le Marconi - V. N.Bixio)** | **226 g** | **ven 30/07/27** | **sab 11/03/28** |
| 528 | | **Cantiere B4 - V.le dei Mille (V. N.Bixio - V. Sette Santi)** | **232 g** | **lun 01/02/27** | **lun 20/09/27** |
| 620 | | **Cantiere B5 - V.le dei Mille (V. Sette Santi - V.le Fanti)** | **188 g** | **ven 24/09/27** | **mer 29/03/28** |
| 738 | | **Cantiere C1 - V.le Fanti Ovest** | **212 g** | **gio 30/03/28** | **ven 27/10/28** |
| 799 | | **Cantiere C2 - V.le Malta (L. Gennarelli - V. Toti)** | **185 g** | **lun 01/02/27** | **mer 04/08/27** |
| 846 | | **Cantiere C3 - V.le Malta (V. Toti - V. D.Chiesa)** | **215 g** | **dom 21/02/27** | **gio 23/09/27** |
| 901 | | **Cantiere C4 - V.le Fanti Sud Est** | **243 g** | **gio 14/10/27** | **lun 12/06/28** |
| 951 | | **Cantiere C5 - V.le Fanti Nord Est** | **252 g** | **mer 03/11/27** | **mar 11/07/28** |
| 1051 | | **Cantiere D1 - V.le Mamiani** | **181 g** | **mar 18/07/28** | **dom 14/01/29** |
| 1107 | | **Cantiere D2 - V.le Duse** | **304 g** | **sab 18/09/27** | **lun 17/07/28** |
| 1151 | | **Cantiere D3 - V.le Verga (V.le D'Annunzio - V. F.Tozzi)** | **234 g** | **sab 18/09/27** | **lun 08/05/28** |
| 1196 | | **Cantiere D4 - V.le Verga (V. F.Tozzi - V. Gignoro)** | **267 g** | **lun 01/02/27** | **lun 25/10/27** |
| 1250 | | **Cantiere E1 - V. del Gignoro (V.le Verga - V. Manni)** | **257 g** | **mar 26/10/27** | **sab 08/07/28** |
| 1337 | | **Cantiere E2 - V. del Gignoro ( V. Manni - V. Pasquali)** | **188 g** | **dom 09/07/28** | **ven 12/01/29** |
| 1369 | | **Cantiere E3 - Rotatoria e strettoia** | **223 g** | **gio 21/10/27** | **mar 30/05/28** |
| 1405 | | **Cantiere E4.a - Palasancat, nuova viabilità** | **477 g** | **mer 01/07/26** | **mer 20/10/27** |
| 1406 | | **Fase A - Attività propedeutiche e realizzazione parziale nuova viabilità** | **301 g** | **mer 01/07/26** | **mar 27/04/27** |
| 1407 | | **Fase B - Demolizione e Ricostruzione Palasancat** | **127 g** | **mer 28/04/27** | **mer 01/09/27** |
| 1408 | | **Fase C - Completamento nuova viabilità** | **49 g** | **gio 02/09/27** | **mer 20/10/27** |
| 1430 | | **Cantiere E4.b - Campo base** | **932 g** | **mer 01/07/26** | **mer 17/01/29** |
| 1433 | | **Cantiere E4.b - Parcheggio Rondinella** | **100 g** | **gio 18/01/29** | **ven 27/04/29** |
| 1435 | | **Cantiere K1 - V. Vitelli** | **211 g** | **lun 01/02/27** | **lun 30/08/27** |
| 1472 | | **Cantiere K2 - V. della Chimera** | **429 g** | **mar 31/08/27** | **mer 01/11/28** |
| 1561 | | **Cantiere L - Ampliamento Deposito Bagno a Ripoli e sistemazione aree a verde Campo Base** | **817 g** | **lun 01/02/27** | **ven 27/04/29** |
| 1562 | | **Fase A - Ampliamento Deposito Bagno a Ripoli** | **579 g** | **lun 01/02/27** | **ven 01/09/28** |
| 1563 | | **Fase B - Sistemazione finale aree a verde Deposito Bagno a Ripoli** | **238 g** | **sab 02/09/28** | **ven 27/04/29** |
| 1599 | | **Cantiere P1 - Parcheggio Rovezzano** | **1032 g** | **mer 01/07/26** | **ven 27/04/29** |
| 1605 | | **Area tecnica stoccaggio in prossimità del cantiere P1** | **1032 g** | **mer 01/07/26** | **ven 27/04/29** |
| 1606 | | **Viabilità alternative limitrofe ai cantieri tram** | **423 g** | **lun 01/02/27** | **mer 29/03/28** |
| 1614 | | **Milestone** | **305 g** | **dom 31/10/27** | **gio 31/08/28** |
| 1615 | | I milestone | 0 g | dom 31/10/27 | dom 31/10/27 |
| 1616 | | II milestone | 0 g | ven 31/03/28 | ven 31/03/28 |
| 1617 | | III milestone | 0 g | gio 31/08/28 | gio 31/08/28 |
| 1618 | | **Attività di completamento di Linea** | **636 g** | **dom 01/08/27** | **ven 27/04/29** |
| 1619 | | **Completamento impianti sistema** | **90 g** | **gio 14/12/28** | **mar 13/03/29** |
| 1621 | | **Arrivo e commisioning del Materiale Rotabile in deposito** | **305 g** | **dom 30/04/28** | **mer 28/02/29** |
| 1622 | | **Attività successive completamento lavorazioni** | **109 g** | **mer 14/03/29** | **sab 30/06/29** |
| 1623 | | **Prove di Integrazione di Sottosistema senza veicolo** | **15 g** | **mer 14/03/29** | **mer 28/03/29** |
| 1629 | | **Prove di Integrazione di Sottosistema con veicolo** | **15 g** | **gio 29/03/29** | **gio 12/04/29** |
| 1633 | | Prove di sistema | 20 g | dom 08/04/29 | ven 27/04/29 |
| 1634 | | **Certificato di ultimazione lavori** | **0 g** | **ven 27/04/29** | **ven 27/04/29** |
| 1635 | | Predisposizione documentazione e richiesta nomina commissione Ministeriale per il pre-esercizio | 15 g | sab 28/04/29 | sab 12/05/29 |
| 1636 | | Completamento Prove di sistema (incluso prove richieste da commissione Ministeriale e durante pre-esercizio) | 45 g | dom 13/05/29 | mar 26/06/29 |
| 1637 | | Rilascio N.O.P. | 0 g | lun 04/06/29 | lun 04/06/29 |
| 1638 | | **Preesercizio** | **27 g** | **lun 04/06/29** | **sab 30/06/29** |
| 1642 | | Inizio servizio | 0 g | sab 30/06/29 | sab 30/06/29 |
| 1643 | | **Avvio all'esercizio commerciale Linea 3.2.2** | **0 g** | **dom 01/07/29** | **dom 01/07/29** |
