RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Passante AV Firenze
Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri

24 giugno 2026

Stato di avanzamento opere

Galleria pari

- Scavati 2.994m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

99%

Galleria dispari

- Scavati 3.000m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

100%

Stato di avanzamento delle frese

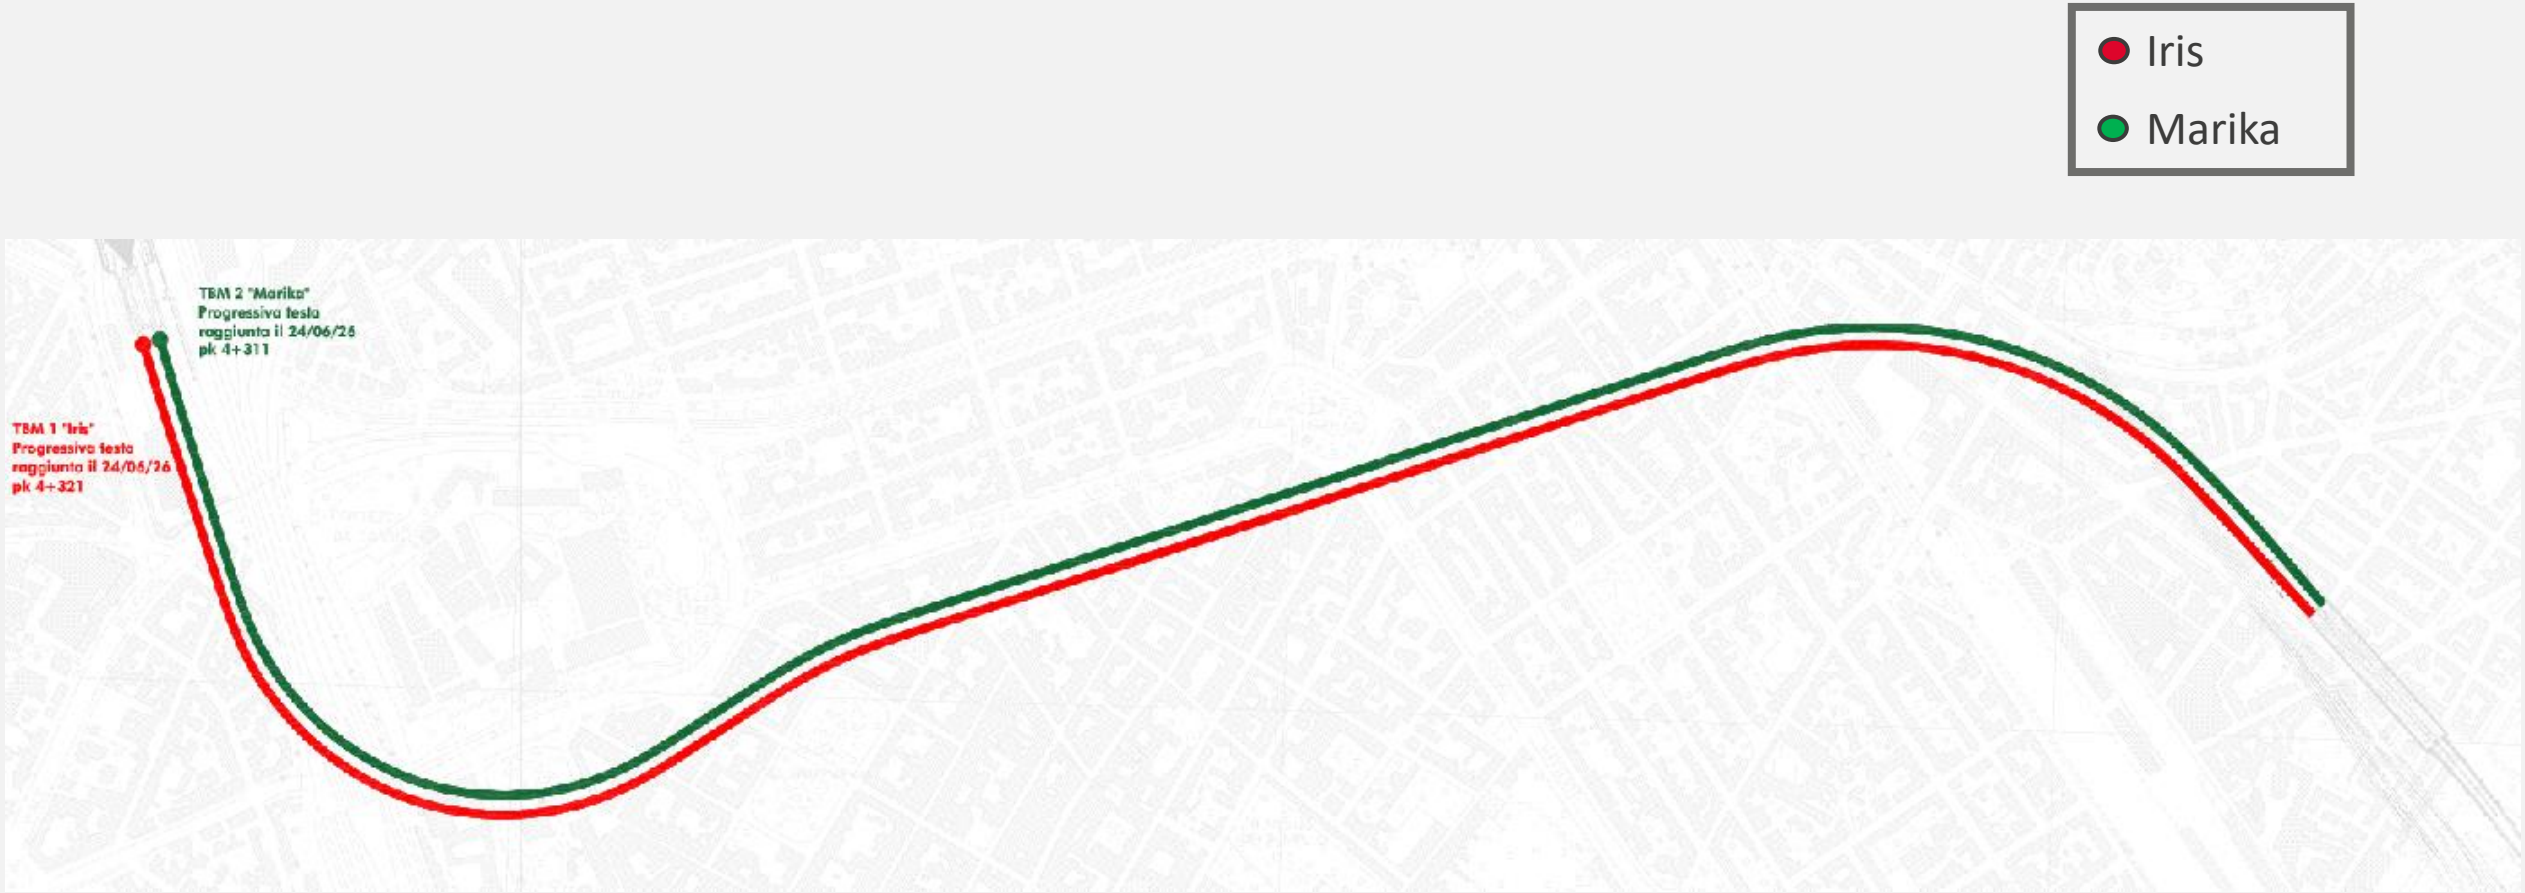

Stato di avanzamento opere

Stazione AV

Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Solaio Mezzanino M1
- Solaio M0 e M2 (testata nord)
- Solaio M0 e M2 (testata sud)
- Travi cuscino
- Passerelle trasversali

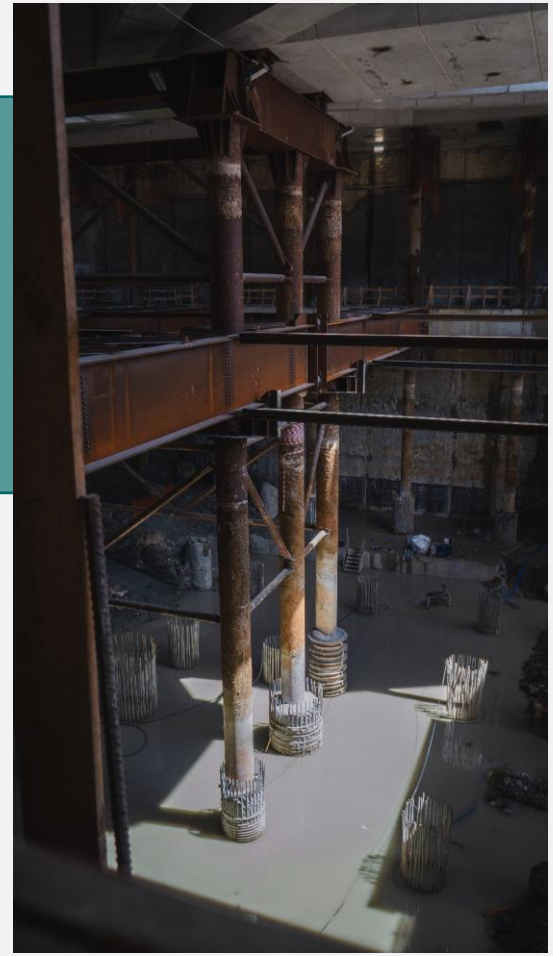

Santa Barbara

- Stesi circa 146.369 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Campo di Marte

In corso attività di trasporto e scarico conci.
È in corso lo scavo della galleria Binario Dispari. Completate le attività di *Compensation grouting*.

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Stazione AV

In corso attività di scavo e montaggio delle armature in testata nord e sud della platea di fondazione.

<u>Pozzo nord:</u> getto vasca di aggottamento e solettone
<u>Pozzo sud:</u> nessuna lavorazione in corso

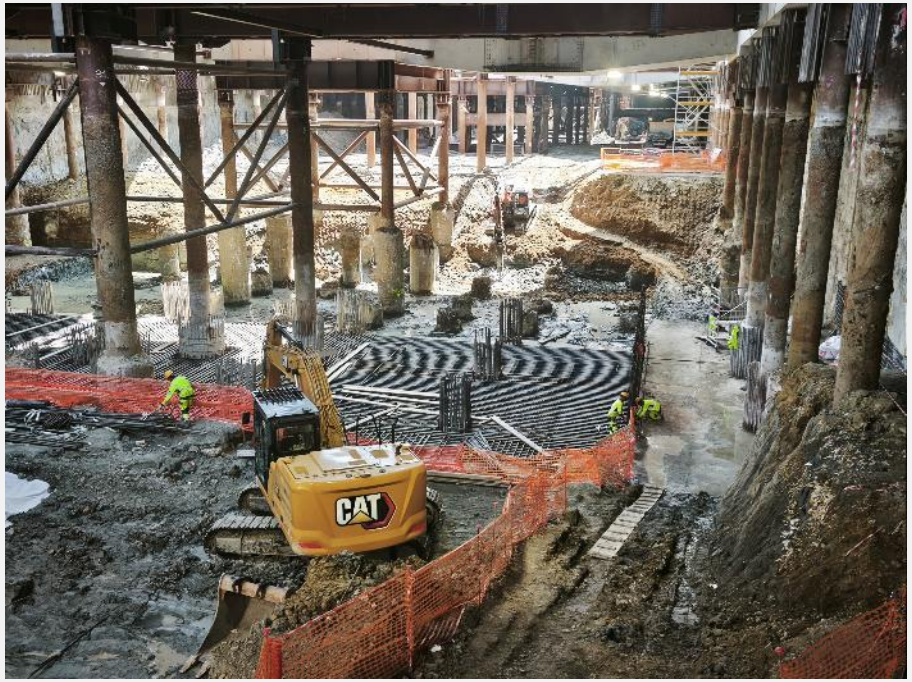

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Fortezza da Basso

Aree 1-2: nessuna lavorazione in corso
Aree 3-4: smontaggio impianti

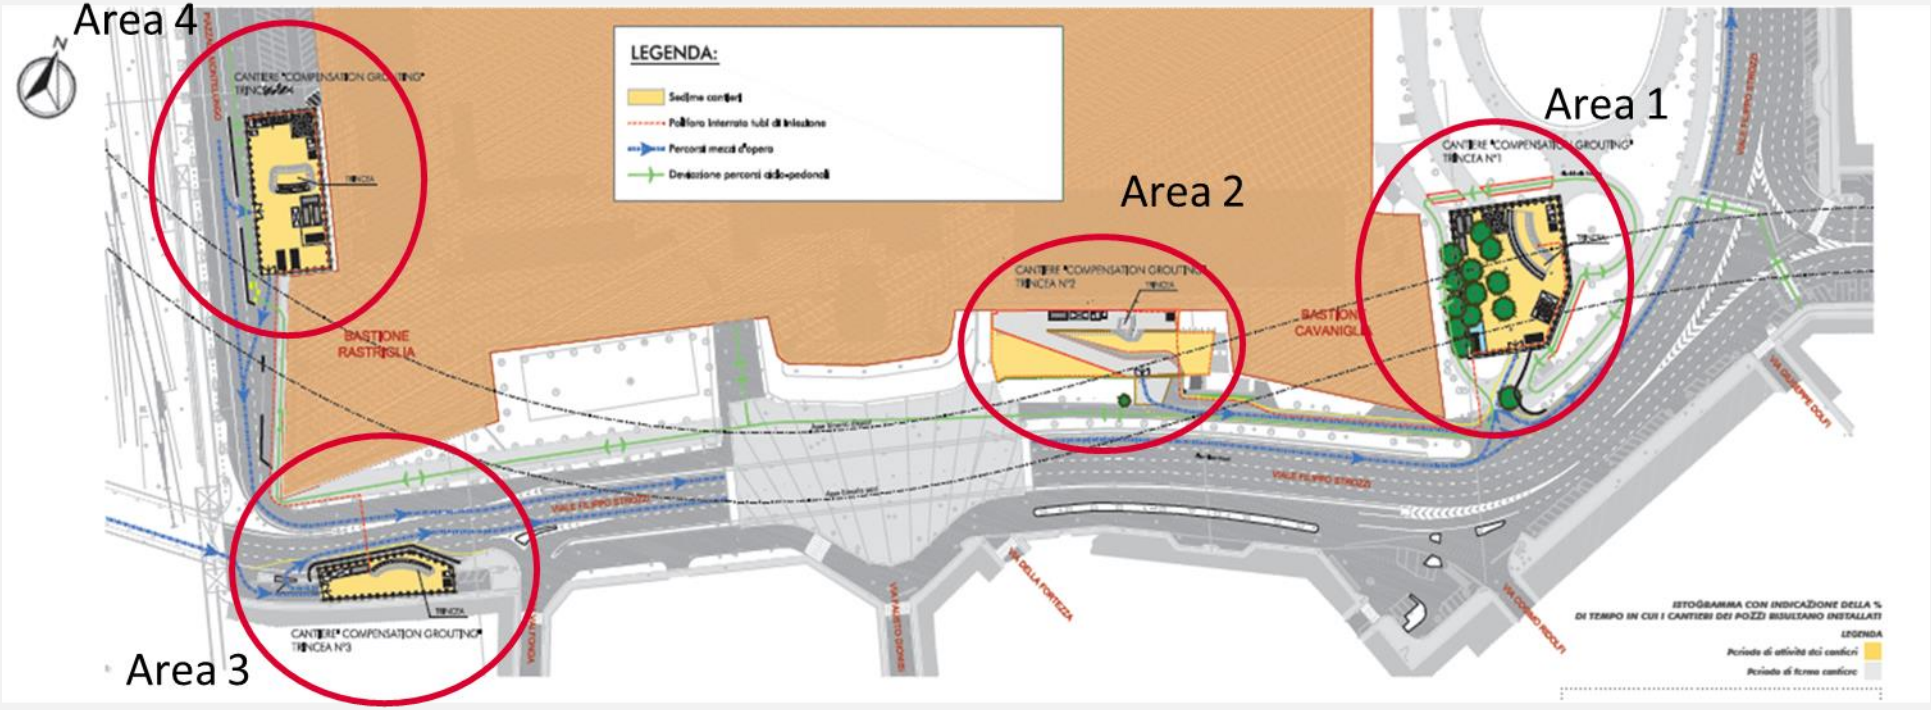

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Via delle Ghiacciaie e Via Cittadella

- Via Cittadella: area in fase di riconsegna
- Via delle Ghiacciaie: area in fase di riconsegna

Via Cittadella

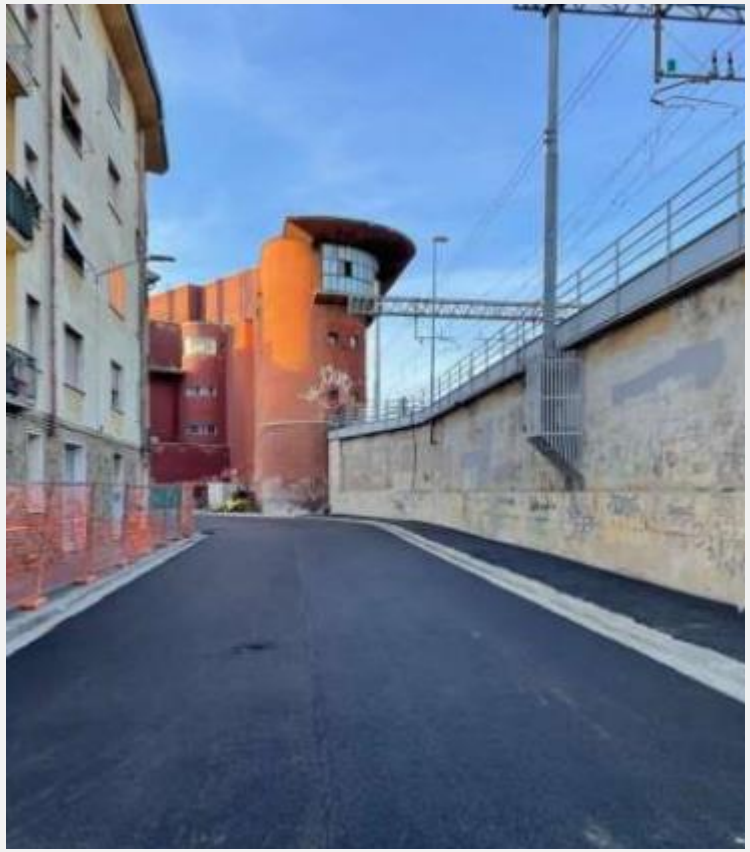

Via delle Ghiacciaie

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Viale Redi, Via del Sodo, Scuola Ottone Rosai

- Viale Redi: area in fase di riconsegna
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze
- Scuola Ottone Rosai: area in fase di riconsegna

Scuola Ottone Rosai

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – By-Pass del torrente Mugnone

- Attività in corso lato viale Redi;
- Via Cosseria: è in corso la seconda fase dei lavori in alveo

Viale Redi

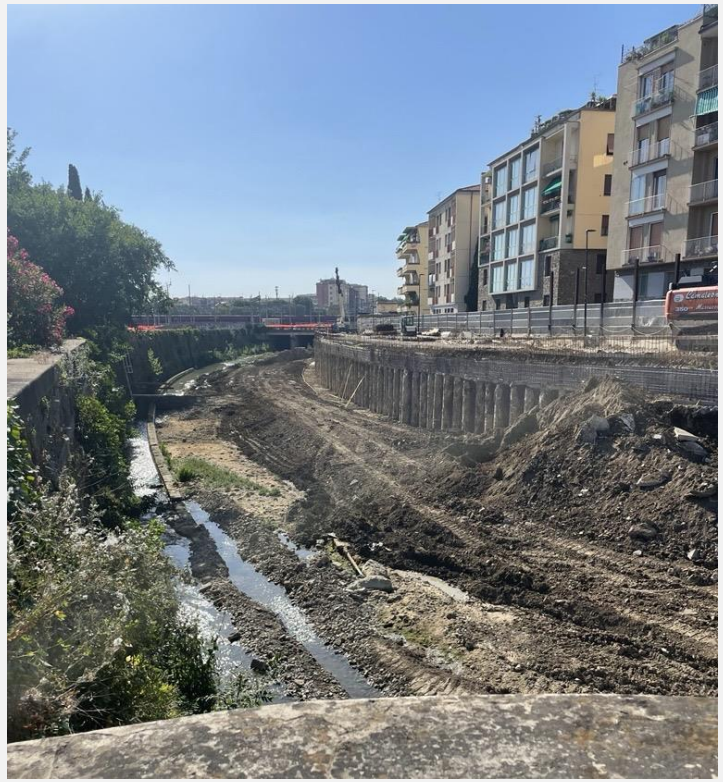

Via Cosseria

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Grazie - Fine
