


LEGENDA

	Limiti di intervento		Area di lavoro
	Accessi passi carrabili		Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica
	Viabilità ordinaria in fase di cantiere		Cordoli prefabbricati spartitraffico, New-Jersey
	Tipo A - Recinzione pesante con rete		
	Tipo D - Recinzione leggera con rete		

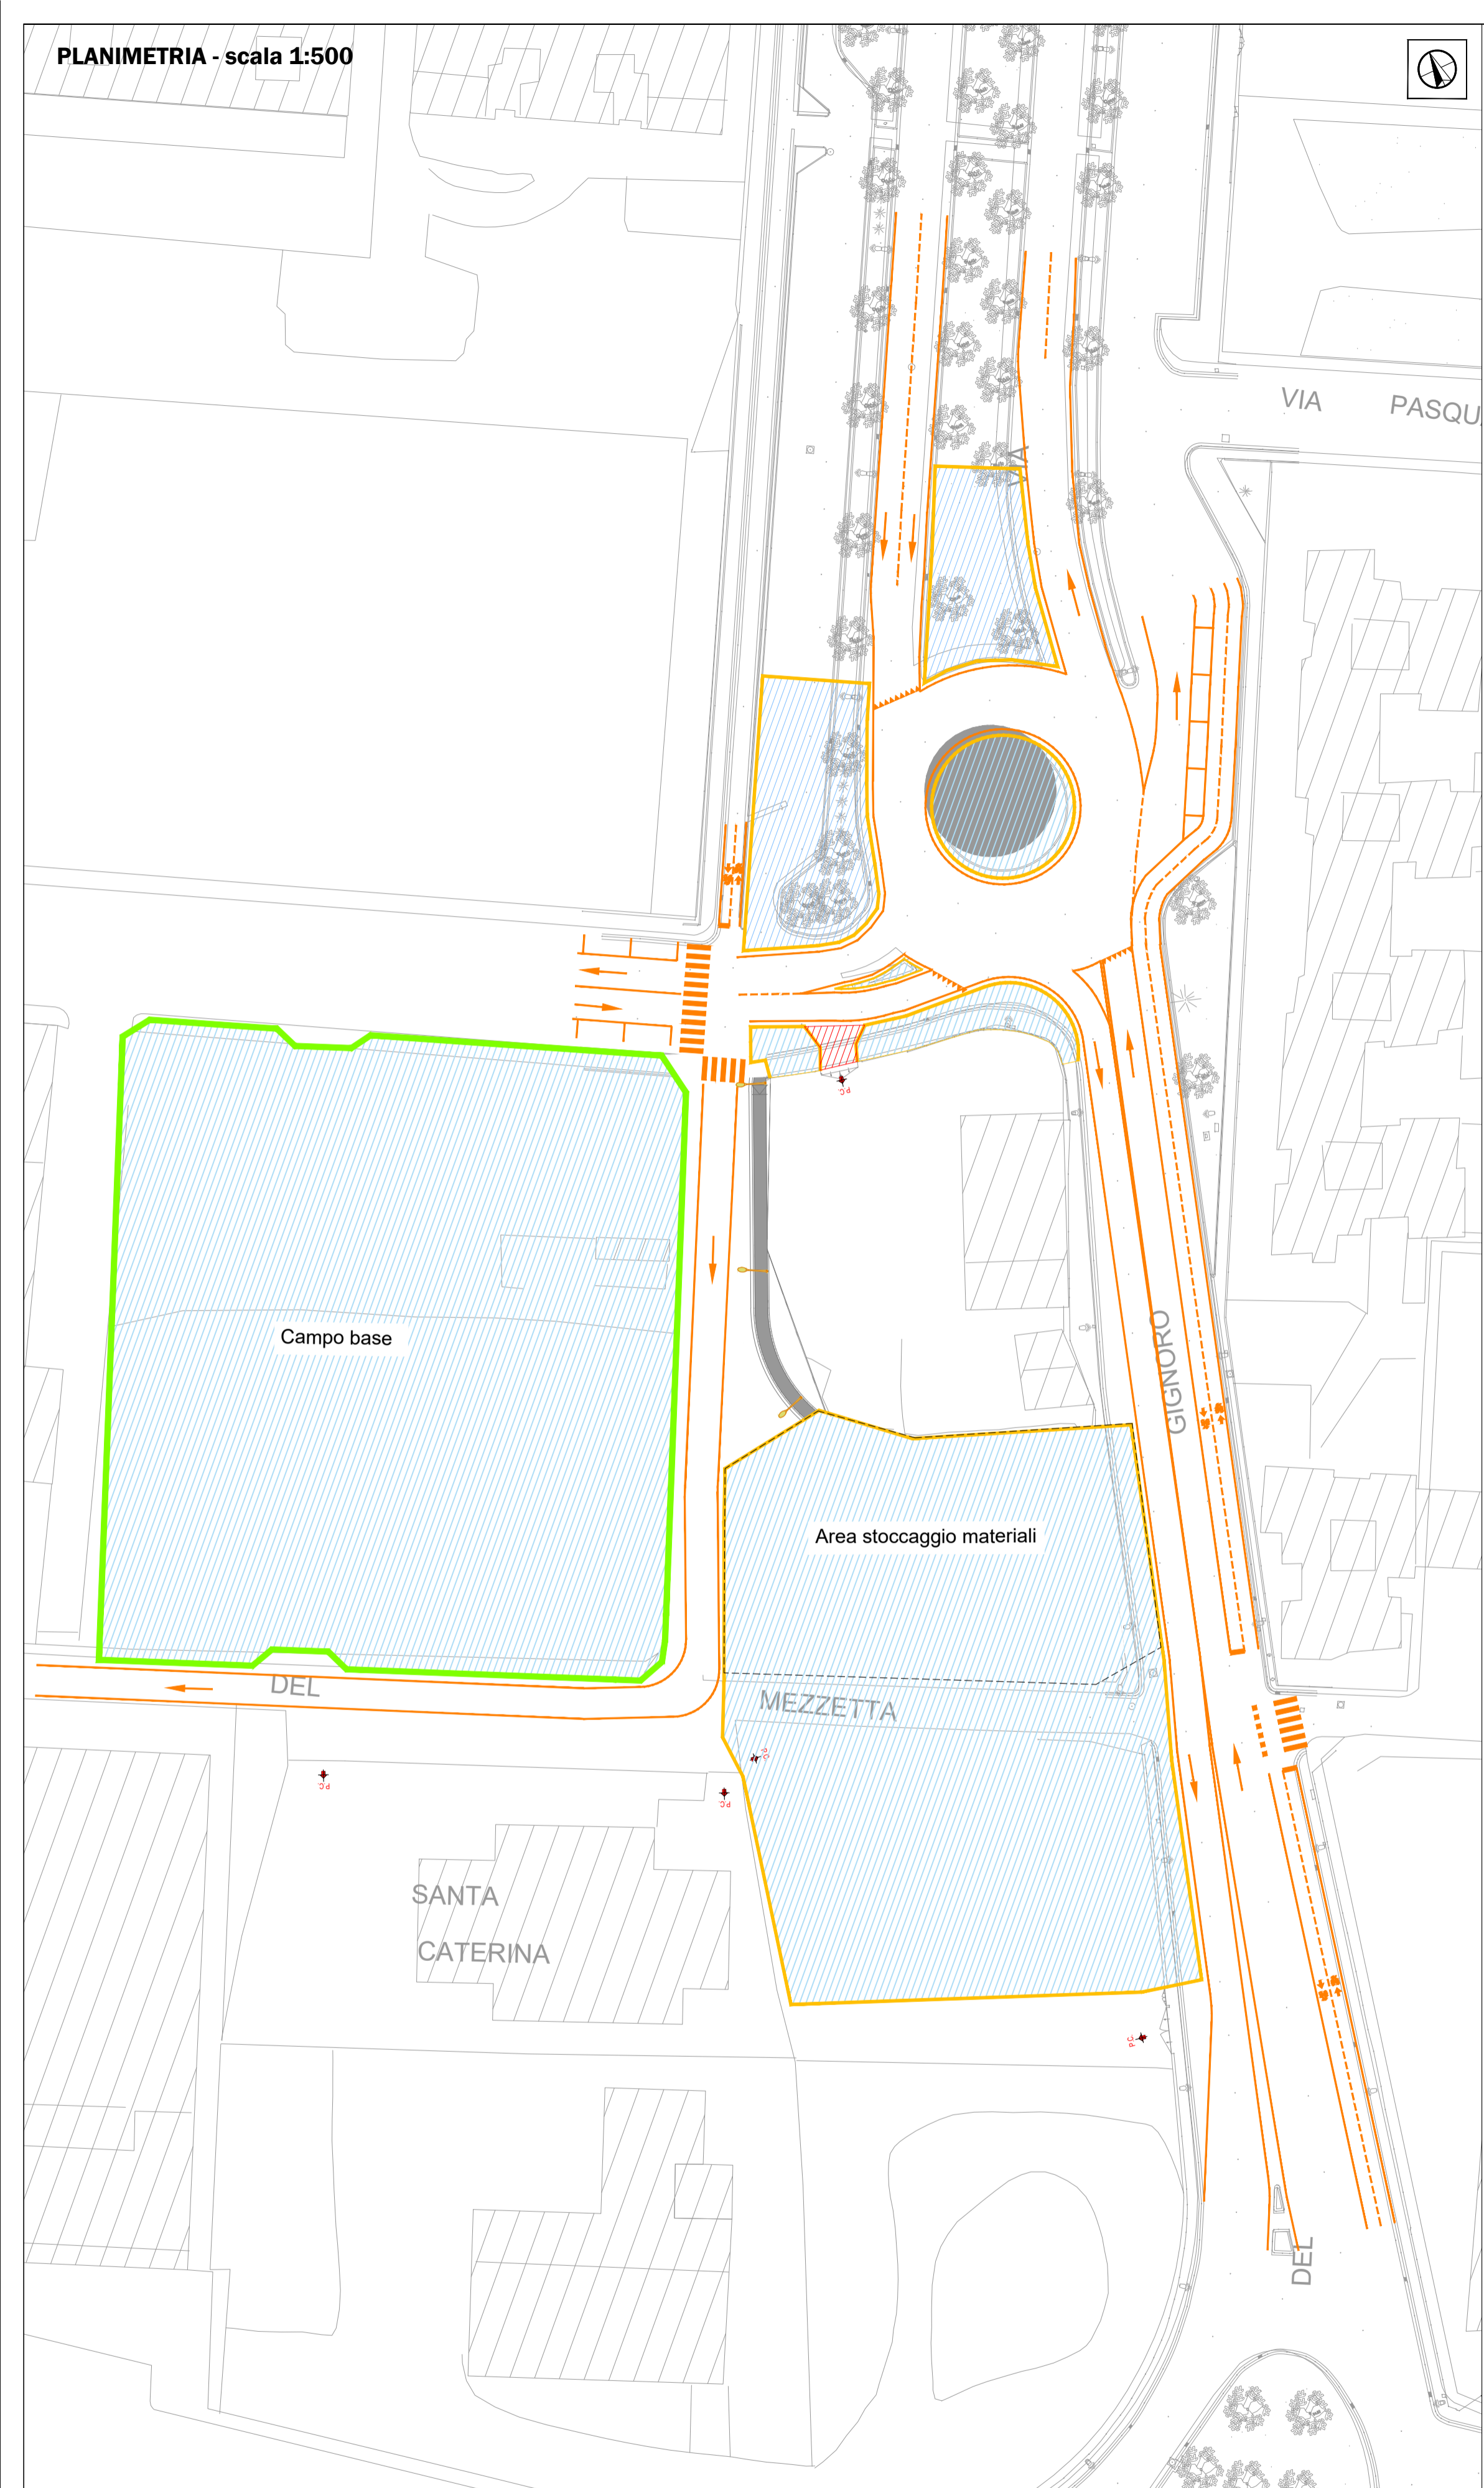

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA CANTIERE DI LINEA - CANTIERE E

Cantiere E4 - Palasancat e nuova viabilità Gignoro 2/3

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

ARCHITECTNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

Prestazioni specialistiche

Ing. Santi Caminiti	Progetto ferroviario e Studi trasportistici
Ing. Angela Tortorella	Progetto degli Impianti Tecnologici
Ing. Maurizio Falzea	Progetto delle Strutture
Arch. Sebastiano Fulci	Progetto Architettonico-Paesaggistico e Inserimento Urbano
Ing. Pietro Caminiti	Progetto delle Opere Idrauliche
Dott. Geol. Roberto Checucci	Progetto Geologico
Dott.ssa Laura Pellegrineschi	Indagini preliminari Archeologiche
Dott. Gabriele Bertolini	Valutazione previsionale Impatto Acustico
Ing. Santi Caminiti	Redazione delle prime disposizioni per la Sicurezza
Ing. Francesca Tamburini	Redazione studi di carattere Ambientale
Ing. Andrea Spinosa	Redazione di Piani Economici e Finanziari

Consulenti

SDAprogetti
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGENERI

ambiente...
società di ingegneria per l'ambiente

Tanden
mobility & transport

ROSSIPRODI ASSOCIATI

COMMESSA FASE COMPARTO DOCUMENTO REV. SCALA NOME FILE

FL322 PD CAN PA-036 0A 1:500 FL322-PD-CAN-PA036-0A.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Novembre 2024	Prima emissione	M.Lazzaro	S. Caminiti	S. Caminiti
0B					
0C					

CANTIERE E4.a - Fase 2a
Lavorazioni:
 - Allestimento cantiere
 - Demolizione Palasancat
Viabilità:
 - Chiusura ingresso via della Mezzetta da via del Gignoro

CANTIERE E4.a - Fase 2b
Lavorazioni:
 - Rimozione area stoccaggio materiali
 - Completamento Nuova viabilità
 - Realizzazione sistemazioni urbane
 - Realizzazione nuovo Palasancat
Viabilità:
 - Chiusura ingresso via della Mezzetta da via del Gignoro

CANTIERE E4.a - Fase finale - Inizio Cantiere E3 Fase 1
Viabilità:
 - Viabilità come da progetto
